




***СЕВКАЗЭНЕРГО***

**АО «Северо-Казахстанская Распределительная  
Электросетевая Компания»**

г. Петропавловск 2025 год

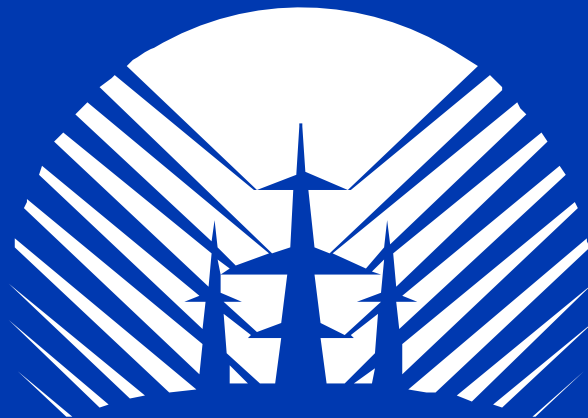

В рамках инвестиционной программы на 2025 год заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ПС 220/35/10 кВ «Смирново», а также договоры на осуществление авторского и технического надзоров за реализацией проекта. По состоянию на первое полугодие 2025 года работы по реконструкции подстанции ведутся: выполнен перезавод кабельных линий 10 кВ, ведутся работы по демонтажу здания РУ-10 кВ.

### До реконструкции



Также в рамках инвестиционной программы на 2025 год заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. Петропавловска. По состоянию на первое полугодие 2025 года работы по реконструкции ЗРУ-10 кВ начаты - выполнены работы по монтажу временных КРУН.



Инвестиционной программой на 2025 год запланированы мероприятия по реконструкции (восстановлению) ВЛ-35кВ «Октябрьская-Коноваловка», ВЛ-35кВ «Покровка-Николаевка», ВЛ-35 кВ "Бишкуль-Озерная" I,II цепь перенесенные с 2024 года.

В первом полугодии 2025 г. были проведены процедуры заключения дополнительных соглашений к договорам 2024 года на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление авторского и технического надзора за реализацией проектов. По итогам первого полугодия работы по реконструкции ВЛ-35кВ «Октябрьская-Коноваловка» завершены. К выполнению работ по восстановлению двух оставшихся ВЛ-35 кВ планируется приступить в третьей декаде июля.





Также в рамках Инвестиционной программы, для своевременного и качественного выполнения работ при осуществлении производственной деятельности, были приобретены средства измерений, инструменты, приспособления, приборы и диагностическое оборудование.

Инвестиционной программой на 2025 год также запланированы следующие мероприятия по реконструкции и модернизации производственных объектов АО «СКРЭК»:

- Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-2-Сибирь»;
- Реконструкция ВЛ -35 кВ «Тимирязево-Б.Хмельницкого»;
- Реконструкция зданий и оборудования ТП, КТПН 10/0,4 кВ;
- Разработка проектно-сметной документации;
- Модернизация оборудования РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомихайловка»;
- Модернизация оборудования РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Николаевка»;

Также запланировано приобретение силового оборудования по мероприятиям:

- Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ «Тимирязево»;
- Реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Сибирь»;
- Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 5;

Выполнение работ по монтажу оборудования планируется произвести в 2026 году.

В первом полугодии 2025 г. по вышеперечисленным мероприятиям проводятся закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ, на осуществление авторского и технического надзора за реализацией проектов, ведутся процедуры заключения договоров, а также ожидается поставка оборудования.
