

160	<p>План трассы и ситуация</p>		<p>Отметки поверхности земли</p>	<p>Расстояние</p>	<p>Пикеты</p>	<p>Виль, длины перемыч, оформит, кассеты</p>
158						
156						
154						
152						
150						
148						
146						
144						
142						
140	<p>Ситуация</p>		<p>Отметки поверхности земли</p>	<p>Расстояние</p>	<p>Пикеты</p>	<p>Виль, длины перемыч, оформит, кассеты</p>
138						
136						
134						
132						
130						
128						
126						
124						
122						
120	<p>Ситуация</p>		<p>Отметки поверхности земли</p>	<p>Расстояние</p>	<p>Пикеты</p>	<p>Виль, длины перемыч, оформит, кассеты</p>
118						
116						
114						
112						
110						
108						
106						
104						
102						
100	<p>Ситуация</p>		<p>Отметки поверхности земли</p>	<p>Расстояние</p>	<p>Пикеты</p>	<p>Виль, длины перемыч, оформит, кассеты</p>
98						
96						
94						
92						
90						
88						
86						
84						
82						
80	<p>Ситуация</p>		<p>Отметки поверхности земли</p>	<p>Расстояние</p>	<p>Пикеты</p>	<p>Виль, длины перемыч, оформит, кассеты</p>
78						
76						
74						
72						
70						
68						
66						
64						
62						
60	<p>Ситуация</p>		<p>Отметки поверхности земли</p>	<p>Расстояние</p>	<p>Пикеты</p>	<p>Виль, длины перемыч, оформит, кассеты</p>
58						
56						
54						
52						
50						
48						
46						
44						
42						
40	<p>Ситуация</p>		<p>Отметки поверхности земли</p>	<p>Расстояние</p>	<p>Пикеты</p>	<p>Виль, длины перемыч, оформит, кассеты</p>
38						
36						
34						
32						
30						
28						
26						
24						
22						
20	<p>Ситуация</p>		<p>Отметки поверхности земли</p>	<p>Расстояние</p>	<p>Пикеты</p>	<p>Виль, длины перемыч, оформит, кассеты</p>
18						
16						
14						
12						
10						
8						
6						
4						
2						

135.34	135.39	135.41	135.42	135.43	135.44	135.45	135.46	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.47	135.
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

160	158	156	154	152	150	148	146	144	142	140	138	136	134	132	130
<p>ПЛАН ТРАССЫ И СИТУАЦИЯ</p>															
<p>Дистанции поверхности земли</p>															
<p>Расстояния</p>															
<p>Пикеты</p>															
<p>Улы, длины, площади, объемы, километры</p>															

The drawing shows a bridge crossing a road. The plan view (top) shows the bridge structure with piers and abutments. The cross-section view (bottom) shows the bridge deck and supports. The drawing includes various dimensions and labels for the bridge structure and the road crossing.


[illegible]

Таблица расчета пересечений

Номер пересечения на плане трассы ВЛ		переход №11	
Наименование пересекемого сооружения		ВЛ 10кВ	
Исходные данные для расчета			
Опоры, ограничивающие проезд	Опора Условное обозначен. №1	У110-1+5	У110-1+5
	Опора Условное обозначен. №2	У110-1+5	У110-1+5
Отметка профиля	Отметка профиля	358+43	358+43
	Отметка профиля	132.03	132.03
Высота подвеса нижнего провода м	опора №1	15.5	15.5
	опора №2	16.2	16.2
Отметка точки подвеса провода на опоре м		147.53	147.53
Расстояние от левой опоры на проф. перех. до перес.		148.42	148.42
Отметка верхней точки пересекемого сооружения		117	60
Марка провода ВЛ на переходе		АС 120/19	АС 120/19
Длина расчетного пролета		157	157
Удельная нагрузка		0.00349	0.00349
Напряжение в расч. реж. в проводе		3.95	3.95
Результаты расчета			
Стрела провеса	расчет. реж.	11	2.07
	аварийн. реж.	11	2.57
Габа-рит	расчет. реж.	С	4.31
	аварийн. реж.	С	4.00
про-вода	расчет. реж.	Сав	7.00
	аварийн. реж.	Сав	7.00

Примечание:
1. На опорах изгибаемых линий ограничивающих пересечение, выдержать зазор между крайней с опорной стороны и ближайшей к пересечению не более 300.
2. Расчет аварийной нагрузки производится с учетом инкрементов осевых нагрузок для 15° без ветра, согласно ПЗЗ п.2.5.12.

19.5.20.4 Э	
Корректировка Справочника ВЛ 10кВ "Навигационно-Авиационная"	
Год	2020
Лист	43
Знак	52
Продолжение профиля ПР353-ПК361	
М. дора 12000 дора 12000	
в М.д. 12000 дора 12000	

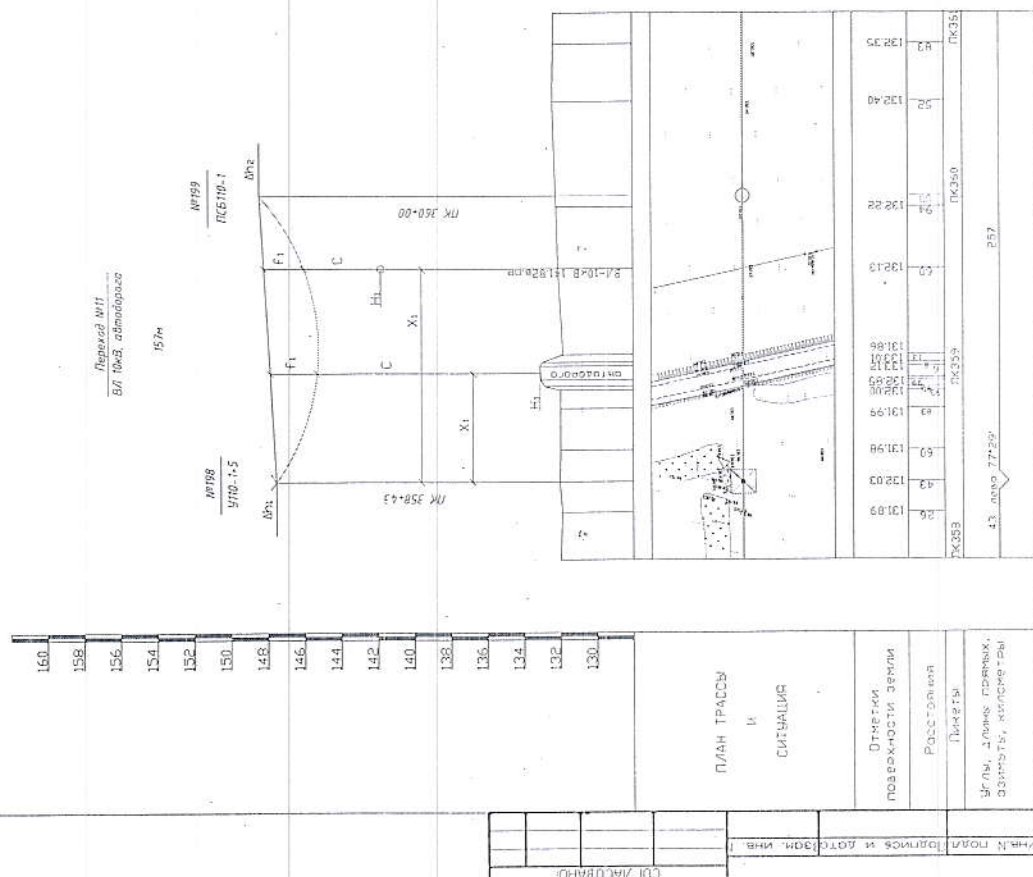

160	ПЛАН ТРАССЫ И СИТУАЦИЯ	Отметки поверхности земли	Ростомия	Пикеты	Углы, длины сторон, площади, календарей
158					
156					
154					
152					
150					
148					
146					
144					
142					
140	ПЛАН ТРАССЫ И СИТУАЦИЯ	Отметки поверхности земли	Ростомия	Пикеты	Углы, длины сторон, площади, календарей
138					
136					
134					
132					
130					
128					
126					
124					
122					
120					
118					
116					
114					
112					
110					
108					
106					
104	ПЛАН ТРАССЫ И СИТУАЦИЯ	Отметки поверхности земли	Ростомия	Пикеты	Углы, длины сторон, площади, календарей
102					
100					
98					
96					
94					
92					
90					
88					
86					
84					
82					
80					
78					
76					
74					
72					
70					
68	ПЛАН ТРАССЫ И СИТУАЦИЯ	Отметки поверхности земли	Ростомия	Пикеты	Углы, длины сторон, площади, календарей
66					
64					
62					
60					
58					
56					
54					
52					
50					
48					
46					
44					
42					
40					
38					
36					
34					
32	ПЛАН ТРАССЫ И СИТУАЦИЯ	Отметки поверхности земли	Ростомия	Пикеты	Углы, длины сторон, площади, календарей
30					
28					
26					
24					
22					
20					
18					
16					
14					
12					
10					
8					
6					
4					
2					
0					

ПЛАН ТРАССЫ
И
СИТУАЦИЯ




[illegible]

Таблица расчета пересечений

Номер пересечения на плане трассы ВЛ	переход №13
Наименование пересекаемого сооружения	автодорога
Исходные данные для расчета	
Опоры, ограничивающие проезжую часть	Опоры
Условие обозначения	Условие обозначения
Пикет установлен	Пикет установлен
Отметка профиля	Отметка профиля
Условие обозначения	Условие обозначения
Пикет установлен	Пикет установлен
Отметка профиля	Отметка профиля
Высота подвеса нижнего провода, м	опора № 1 опора № 2
опора №1	опора №1
Отметка точки подвеса провода на опоре, м	опора № 2
Расстояние от левой опоры на проф. верх. до перес.	X1, м
Отметка верхней точки пересечения проводов	H1, м
Марка провода ВЛ на переходе	АС 120/19
Длина расчетного пролета	Lp, м
Удельная нагрузка	Уд, кг/м ²
Напряжение в расч. рек.	G, кг/м ²
в аварий. рек.	Gав, кг/м ²
Результаты расчета	
Стрела провеса	f1, м
Таблица нормативный про-вода	Тав С Сав рек. рек.
	2,99 6,28 7,00

направлений по пересечению с границей

[illegible]

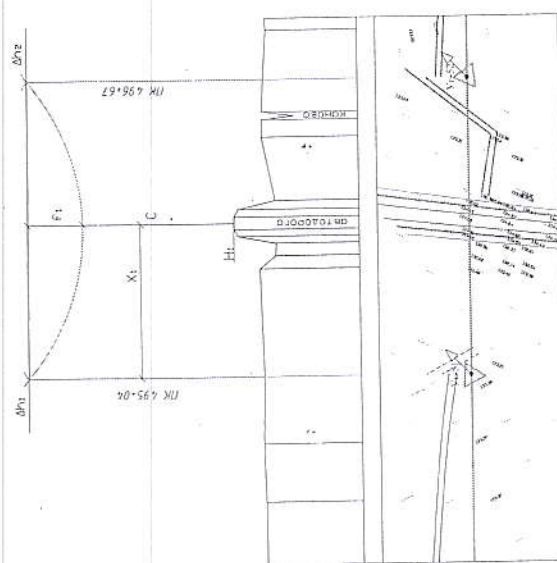

Номер пересечения на плане Трассы ВЛ		ВЛ220кВ		переход №13	
Наименование пересекаемого сооружения		ВЛ110кВ(1цепь)		ВЛ110кВ(2цепи)	
Исходные данные для расчета					
Опоры, отключающие пролет пересечения	Опоры Условные обозначен. №1 Пикет установки Отметка профиля	1У110-5кВ291 51442 133.62	1У110-5кВ291 51442 133.62	1У110-5кВ291 51442 133.62	1У110-5кВ291 51442 133.62
Опоры пролет пересечения	Опоры Условные обозначен. №2 Пикет установки Отметка профиля	1У110-5кВ292 51622 133.55	1У110-5кВ292 51622 133.55	1У110-5кВ292 51622 133.55	1У110-5кВ292 51622 133.55
Высота подвеса нижнего провода, м	опора № 1	9	9	9	9
	опора № 2	9	9	9	9
Отметка точки подвеса провода на опоре, м	опора № 1 Дн1			142.62	142.62
	опора № 2 Дн2			142.55	142.55
Расстояние от нижней опоры на проф. перех. до перес.	Х1, м	62	135	144	144
Отметка верхней точки пересек. сооружения	Н1, м	144.48	148.61	148.61	148.61
Длина пролета	Лр, м	180	180	180	180
Удельная нагрузка	Уд, кг/м2	0.00349	0.00349	0.00349	0.00349
Напряжение в проводе	G1, кг/мм2	3.685	3.685	3.685	3.685
Результаты расчета					
Стрела провеса	f1	2.46	2.88	2.85	2.45
Габа-рит	авар. рит	-5.35	-8.92	-8.50	-8.50
про-авар	нормативный рит	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00
нормативный рит	Сав				

[illegible][illegible]

1975-76-4 36

Важнейшим направлением в развитии науки является создание новых методов исследования, позволяющих получать более полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

[illegible][illegible]

194520-4 3C

Коррекционная станция ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Липовиная".

[illegible][illegible]

мониторинг тяжёлых металлов и стресс-индикаторов

2010


Figure	Figure	Figure
Figure 1	Figure 2	Figure 3
Figure 4	Figure 5	Figure 6
Figure 7	Figure 8	Figure 9
Figure 10	Figure 11	Figure 12
Figure 13	Figure 14	Figure 15
Figure 16	Figure 17	Figure 18
Figure 19	Figure 20	Figure 21
Figure 22	Figure 23	Figure 24
Figure 25	Figure 26	Figure 27
Figure 28	Figure 29	Figure 30
Figure 31	Figure 32	Figure 33
Figure 34	Figure 35	Figure 36
Figure 37	Figure 38	Figure 39
Figure 40	Figure 41	Figure 42
Figure 43	Figure 44	Figure 45
Figure 46	Figure 47	Figure 48
Figure 49	Figure 50	Figure 51
Figure 52	Figure 53	Figure 54
Figure 55	Figure 56	Figure 57
Figure 58	Figure 59	Figure 60
Figure 61	Figure 62	Figure 63
Figure 64	Figure 65	Figure 66
Figure 67	Figure 68	Figure 69
Figure 70	Figure 71	Figure 72
Figure 73	Figure 74	Figure 75
Figure 76	Figure 77	Figure 78
Figure 79	Figure 80	Figure 81
Figure 82	Figure 83	Figure 84
Figure 85	Figure 86	Figure 87
Figure 88	Figure 89	Figure 90
Figure 91	Figure 92	Figure 93
Figure 94	Figure 95	Figure 96
Figure 97	Figure 98	Figure 99
Figure 100	Figure 101	Figure 102
Figure 103	Figure 104	Figure 105
Figure 106	Figure 107	Figure 108
Figure 109	Figure 110	Figure 111
Figure 112	Figure 113	Figure 114
Figure 115	Figure 116	Figure 117
Figure 118	Figure 119	Figure 120
Figure 121	Figure 122	Figure 123
Figure 124	Figure 125	Figure 126
Figure 127	Figure 128	Figure 129
Figure 130	Figure 131	Figure 132
Figure 133	Figure 134	Figure 135
Figure 136	Figure 137	Figure 138
Figure 139	Figure 140	Figure 141
Figure 142	Figure 143	Figure 144
Figure 145	Figure 146	Figure 147
Figure 148	Figure 149	Figure 150
Figure 151	Figure 152	Figure 153
Figure 154	Figure 155	Figure 156
Figure 157	Figure 158	Figure 159
Figure 160	Figure 161	Figure 162
Figure 163	Figure 164	Figure 165
Figure 166	Figure 167	Figure 168
Figure 169	Figure 170	Figure 171
Figure 172	Figure 173	Figure 174
Figure 175	Figure 176	Figure 177
Figure 178	Figure 179	Figure 180
Figure 181	Figure 182	Figure 183
Figure 184	Figure 185	Figure 186
Figure 187	Figure 188	Figure 189
Figure 190	Figure 191	Figure 192
Figure 193	Figure 194	Figure 195
Figure 196	Figure 197	Figure 198
Figure 199	Figure 200	Figure 201
Figure 202	Figure 203	Figure 204
Figure 205	Figure 206	Figure 207
Figure 208	Figure 209	Figure 210
Figure 211	Figure 212	Figure 213
Figure 214	Figure 215	Figure 216
Figure 217	Figure 218	Figure 219
Figure 220	Figure 221	Figure 222
Figure 223	Figure 224	Figure 225
Figure 226	Figure 227	Figure 228
Figure 229	Figure 230	Figure 231
Figure 232	Figure 233	Figure 234
Figure 235	Figure 236	Figure 237
Figure 238	Figure 239	Figure 240
Figure 241	Figure 242	Figure 243
Figure 244	Figure 245	Figure 246
Figure 247	Figure 248	Figure 249
Figure 250	Figure 251	Figure 252
Figure 253	Figure 254	Figure 255
Figure 256	Figure 257	Figure 258
Figure 259	Figure 260	Figure 261
Figure 262	Figure 263	Figure 264
Figure 265	Figure 266	Figure 267
Figure 268	Figure 269	Figure 270
Figure 271	Figure 272	Figure 273
Figure 274	Figure 275	Figure 276
Figure 277	Figure 278	Figure 279
Figure 280	Figure 281	Figure 282
Figure 283	Figure 284	Figure 285
Figure 286	Figure 287	Figure 288
Figure 289	Figure 290	Figure 291
Figure 292	Figure 293	Figure 294
Figure 295	Figure 296	Figure 297
Figure 298	Figure 299	Figure 300
Figure 301	Figure 302	Figure 303
Figure 304	Figure 305	Figure 306
Figure 307	Figure 308	Figure 309
Figure 310	Figure 311	Figure 312

Ведомость монтажных тяжёлых и стрел пробного троса

[illegible][illegible][illegible]


Расчет
расстановки счетной вибрации ВЛ 110 кВ Новоухайловск-Литейная
Провод AC 120/19

№	Примечания архитектуры	Длина пролета		Марка газетели/номер отпора	№ рисунка	Место установки газетели		
		Отпора А	Отпора Б					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Навесной лапач III-3-63	Навесной лапач III-3-63	Мелкое 100 м	нет	нет	-	-	-
2	Навесной лапач III-3-63	Навесной лапач III-3-63	100-150	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	Нет	1	0,65	-
3	Навесной лапач III-3-63	Навесной лапач III-3-63	Большее 150	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	1	0,65	0,8
4	Навесной лапач III-3-63	Поддерживающий лапач III-3-5	Мелкое 100 м	нет	нет	-	-	-
5	Навесной лапач III-3-63	Поддерживающий лапач III-3-5	100-150	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	Нет	1	0,65	-
6	Навесной лапач III-3-63	Поддерживающий лапач III-3-5	Большее 150	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	1,2	0,65	0,8
7	Поддерживающий лапач III-3-5	Поддерживающий лапач III-3-5	Мелкое 100 м	нет	нет	-	-	-
8	Поддерживающий лапач III-3-5	Поддерживающий лапач III-3-5	100-150	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	Нет	2	0,65	-
9	Поддерживающий лапач III-3-5	Поддерживающий лапач III-3-5	Большее 150	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	ГВ-1,2,0,8-11-500/16-20	2	0,65	0,8

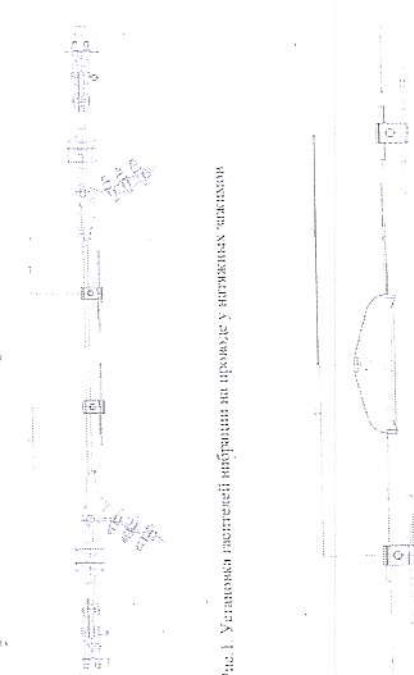

Ветеринары рекомендуют на период лечения отказаться от жареной и копченой пищи.

№	Примечание	Длина проката	Марка стали	№ рисунка	Место установки
1	2	3	4	5	6
1	Патентовый замок НКС-1-1Б	100-150 мм	Нет	Нет	-
2	Патентовый замок НКС-1-1Б	100-150 мм	ГВ-0,8х0,6-9,1-400/10-13	Нет	0,5
3	Патентовый замок НКС-1-1Б	Более 150 мм	ГВ-0,8х0,6-9,1-400/10-13	Нет	0,5
4	Патентовый замок НКС-1-1Б	Более 100 мм	Нет	Нет	-
5	Патентовый замок НКС-1-1Б	100-150 мм	ГВ-0,8х0,6-9,1-400/10-13	Нет	0,5
6	Патентовый замок НКС-1-1Б	Более 150 мм	ГВ-0,8х0,6-9,1-400/10-13	Нет	0,5
7	Патентовый замок НКС-1-1Б	Более 100 мм	Нет	Нет	-
8	Патентовый замок НКС-1-1Б	100-150 мм	ГВ-0,8х0,6-9,1-400/10-13	Нет	0,5
9	Патентовый замок НКС-1-1Б	Более 150 мм	ГВ-0,8х0,6-9,1-400/10-13	Нет	0,5

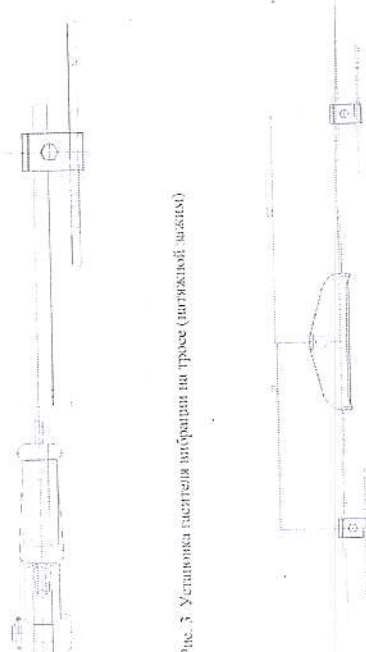

Таб. 3. Методичні підходи до впровадження ІТ (на прикладі банків)



Quesada, C. & N. J. B. 1999. *El agua en el mundo: la crisis del siglo XXI*. Ed. J. A. Garza. pp. 1-10. <http://www.unep.org/press/docs/agua/agua.htm>

[illegible]

[illegible]

Поз	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Железобетонные изделия							
11.	Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6м	ГОСТ 22687-85	СК22-1-21	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	239	484.7	
12.	Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=22.6м	ГОСТ 22687-85	СК22-3-11	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	31	6086	
13.	Стойка коническая железобетонная центрифугированная L=26м	ГОСТ 22687-85	СК26-1-11	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	5	6871	
14.	Фундамент в комплекте с оголовниками и деталями крепления	3.4.07-115	ФЗ-АМ	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	72	4300	
15.	Фундамент в комплекте с оголовниками и деталями крепления	3.4.07-115	ФЗ-АМ	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	8	6300	
16.	Анкерная плита	3.4.07-115	ПА2-1	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	164	1600	
17.	Ригель	3.4.07-115	АР-5	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	147	500	
18.	Ригель	3.4.07-115	Р1-А	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	80	500	
19.	Подпятник	3.4.07-115	П-2	Талдыкорганский з-д ЖБИ	шт	275	41	
	2. Металлические опоры и конструкции							
1	Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора с горизонтальным расположением проводов У110-5	3.4.07.2-156		100 "ТК Метакон" г.Талдыкорган	шт.	2	3737	в т.ч. цинк-140кг. на опору
2	Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У110-1-5	3.4.07-68/73		100 "ТК Метакон" г.Талдыкорган	шт.	7	6604	в т.ч. цинк-262кг. на опору
3	Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У110-1-9	3.4.07-68/73		100 "ТК Метакон" г.Талдыкорган	шт.	4	8140	в т.ч. цинк-322кг. на опору
4	Металлическая унифицированная стальная оцинкованная опора У110-1	3.4.07-68/73		100 "ТК Метакон" г.Талдыкорган	шт.	7	4396	в т.ч. цинк-195кг. на опору
	3. Металлические конструкции для железобетонной опоры ПУСБ110-1118шт						347/ 2776 ;	
1	Траверса	94.95ммх1-57	Б4С-1		ш	1	40	40/ 320
2	Траверса	94.95ммх1-64	Б11С-1		ш	1	90	80/ 640
3	Траверса	94.95ммх1-55,63	Б18С-1		ш	1	140	140/ 1120
4	Тросостойка	94.95ммх1-85	Б33С-1		ш	1	50	50/ 400
5	Подвеска	94.95ммх1-88	550		ш	2	8	16/ 128
6	Специальные болты	94.95ммх1-91			ш	1	21	21/ 168
	3.1 Металлические конструкции для железобетонной опоры ПБ110-15 (23шт)	3.4.07-131					240.3/ 55509,3	
1	Траверса	94.95ммх1-57	Б4С-1		ш	2	40	80/ 18480

1945.20-4.ЭС									
Корректировка Строительств ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная"									
Изм.	Кол.	Лист	№Зак.	Подпись	Дата	ВЛ110кВ "Новомихайловка-Литейная"			
						Специаль	Лист	Листов	
						РП	1	4	
Ген.	Тех.нач.	С.С.			01.09.20	100			
Ведущий	Инженер				01.09.20	"Проект Электроснабжения"			
Проектант	Инженер				01.09.20	Спецификация оборудования			
Исполнитель	Инженер				01.09.20	Спецификация оборудования			

Итого: N подл. подписей и датиров. инв. N

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, оптового листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2	Траверса	94.95mm-64	Б5С		шт	1	92	92/ 21252
3	Тросостойка	94.95mm-85	Б33С-1		шт	1	50	50/ 11550
4	Специальные болты	94.95mm-91			шт	1	14	14/ 3234
3.2	Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-11(3шт)						104.9/ 32519	
1	Траверса	94.95mm-67.68	Б20С-1		шт	1	62	62/ 1922
2	Траверса	94.95mm-69.70	Б21С-1		шт	1	927	927/ 28737
3	Полухомут	94.95mm-89	Б564н		шт	1	9	9/ 279
4	Полухомут	94.95mm-68	Б515-2		шт	2	6	12/ 2712
5	Шайба	94.95mm-88	Б105-9		шт	2	2	4/ 124
6	Специальные болты	94.95mm-91				1	35	35/ 1085
3.3	Металлические конструкции для железобетонной опоры ПСБ110-11(5шт)						284/ 1420	
1	Траверса	3082mm-m2-26	Б4		шт	2	38	76/ 380
2	Траверса	3082mm-m2-31	Б9		шт	1	124	124/ 520
3	Тросостойка	3082mm-m2-45	Б35		шт	1	71	71/ 355
4	Специальные болты	3082mm-m2-49			шт	1	13	13/ 65
4.	4. линейная арматура							4 1% надбавкой
4.1	Изоляторы стеклянный линейный подвесной параллельный	ТУ 34.16.10253-89	ПС 120	"ЮСК"	шт	3157	3.9	
4.2	Изоляторы стеклянный линейный подвесной параллельный	ТУ 34.16.10253-88	ПС 10Е	"ЮСК"	шт	7151	3.4	
4.3	Узел крепления	ТУ 34.13.10310-90	КТП-7-25/КТП-7-2В	"ЮСК"	шт	900/ 246	1.12/0.7	
4.4	Ушко одноплечное	ТУ34.49-014-4.0064547-01	У1-7-16	"ЮСК"	шт	246	0.57	
4.5	Ушко укороченное	ТУ34.49-014-4.0064547-01	У1К-7-16	"ЮСК"	шт	101	0.6	
4.6	Ушко двухплечное	ТУ34.49-014-4.0064547-01	У2-12-16	"ЮСК"	шт	315	1.54	
4.7	Скоба	ТУ 34.13.11420-89	СК 7-1А/СК 12-1А	"ЮСК"	шт	101/ 518	0.38/0.92	
4.8	Скоба	ТУ 34.13.11420-89	СК4-10-1	"ЮСК"	шт	101	0.67	
4.9	Серьга	ТУ34.49-014-4.0064547-01	СР 7-15/ СР 12-16	"ЮСК"	шт	101/ 309	0.37/0.41	
4.10	Зажим поддерживающий глухой	ТУ 34.13.10029-80	ПГН-3-5	"ЮСК"	шт	894	1.33	
4.11	Зажим поддерживающий глухой	ТУ 34.13.10029-80	ПГН-2-6А	"ЮСК"	шт	246	0.94	
4.12	Звено промежуточное регулируемое	ТУ34.49-014-4.0064547-01	ЗРР-7-1/ ЗРР-12-1	"ЮСК"	шт	101/ 309	1.31/3.69	
4.13	Звено промежуточное прямое	ТУ34.49-014-4.0064547-01	ЗР-7-5/ ЗР-12-6	"ЮСК"	шт	101/ 624	0.44/0.94	
4.14	Звено промежуточное прямое	ТУ34.49-014-4.0064547-01	ЗТМ-7-3/ ЗТМ-12-3	"ЮСК"	шт	101/ 309	0.7/1.9	
Итого								1045.90.4 30.50

Итого: 1045.90.4 30.50

подл. подпись и дата: 30.05.2019

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4.15.	Зажим заземляющий	ГОСТ Р 511-98	ЗПС-50-3В	"ЮСК"	шт	594	0,068	
4.16.	Зажим напояной клиновой коушный	ТУ 34.13.10294-90	НKK-1-15	"ЮСК"	шт	101	0,8	
4.17.	Зажим напояной болтовой	ТУ3449-014-40064547-01	НБ-3-65	"ЮСК"	шт	315	4,14	
4.18.	Гаситель вибрации линейный	ТУ3449-014-40064547-01	ГВ-15-11-400/16-20	"ЮСК"	шт	1770	4,33	
4.19.	Гаситель вибрации линейный	ТУ3449-014-40064547-01	ГВ-0,8-5,1-350/10-13	"ЮСК"	шт	590	2,32	
4.20.	Зажим соединительный скручиваемый	ТУ 34.27.10679-84	СОАС-120-3	"ЮСК"	шт	83	0,920	
4.21.	Шлейфовой соединительный зажим спиральный	ТУ 34.49-036-27560230-06	ШС-15,2-01		шт	60	0,059	
5. Оплетки (5110-15111-15112-15123-1)								
5.1.	Клиновидный зажим	3.407-131	Б 722		шт	162	3,0	с 1% надбавкой.
5.2.	Клиновидный зажим	3.407-131	Б 720		шт			
5.3.	Клиновидный зажим	3.407-131	Б 721		шт			
5.4.	Зажим напояной пресвуемый	3.407-131	НС-150-1		шт	10	3,8	с 1% надбавкой.
5.5.	Скоба	3.407-131	СК-16-1А		шт	10	2,0	с 1% надбавкой.
5.6.	Металлическая деталь	3.407-131	Б 723		шт	324	3,0	с 1% надбавкой.
5.7.	Металлическая деталь	3.407-131	Б724		шт	555	1,0	с 1% надбавкой.
5.8.	Металлическая деталь	3.407-131	Б740		шт	10	10	с 1% надбавкой.
5.9.	Металлическая деталь	3.407-131	Б727-1		шт	20	3,0	с 1% надбавкой.
5.10.	Шплинт 10х10-001	ГОСТ 357-79	10х10-001		шт	333	0,06	с 1% надбавкой.
6. Провода и тросы								
6.1.	Сплавляющийся провод неизолированный	ГОСТ 839-80	АС 120/19	"Интеркоммерц"	м/км	77,23/163,98	4,71	с 5% надбавкой
6.2.	Канат стальной (грозозащитный трос) 9,1-Г-В-С-Н-Р-1370(140)	ГОСТ 3063-80	С 50	"Униксдаль"	м/км	22,82/54,66	4,17,5	с 5% надбавкой
6.3.	Канат стальной 15,5-Г-В-С-Р-1372(140)	ГОСТ 3063-80	TKO 15,5		м/км	0,155/0,134	1160	с 3% надбавкой. Масса 1км
6.4.	Канат стальной 17-Г-В-СС-Р-1372(140)	ГОСТ 3063-80	TKO 17		м/км	7,9/5,5	1435	с 3% надбавкой. Масса 1км
7. Металл для заземления опор.								
7.1.	Сталь круглая оцинкованная Ø12мм	ГОСТ 2590-2006	С12		м/км	3,59/3,2	0,888	
7.2.	Сталь полосовая 6х40х160 (планка)	ГОСТ 103-76			шт	40	0,3	

Данный лист выдан взятмен ЛЗ ЭССО

Лист	1945 20-4 ЭССО	Лист	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

г. Петропавловск

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Казановского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Акт приемки выполненных работ - документ, оформляемый Подрядчиком в случаях, предусмотренных Договором, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, подтверждающий факт выполнения определенного объема Работ Подрядчиком в отчетном периоде, подписываемый уполномоченными представителями Сторон;

АСУПФИА «Ellipse» - автоматизированная система управления производственными фондами и активами «Ellipse»;

Акт освидетельствования скрытых работ - документ, оформляемый Подрядчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан после завершения каждого этапа Скрытых работ по результатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций, подписываемый уполномоченными представителями Сторон;

Дефект - каждое отдельное несоответствие признака технического состояния объекта установленным требованиям;

Материалы - расходные материалы, оборудование, механизмы, узлы, запасные части и другие товарно-материальные ценности, используемые Подрядчиком при выполнении Работ;

НТД - нормативно-техническая и иная нормативная документация, действующая в Республике Казахстан, а также Строительные нормы и правила (СНиП);

Оборудование - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой;

Объект - ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная», СКО, Мамлютский район, применительно к которому предусмотрены Работы, и который в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан, подлежит вводу в эксплуатацию, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

Персонал Подрядчика - означает работников Подрядчика, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ на условиях Договора, имеющих необходимую квалификацию и опыт для выполнения Работ по Договору;

Площадка - территория, предназначенная или используемая Подрядчиком для выполнения Работ по Договору;

Правила - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11.02.2015г. №73;

ПСД - проектно-сметная документация на строительство Объекта, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями НТД;

Работа - Строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная». Понятие «Работа» означает весь объем работ, предусмотренный Договором, подлежащий выполнению Подрядчиком за риск и за счет средств Подрядчика, под его имущественную ответственность, собственными силами (или привлеченными субподрядчиками на условиях Договора), Персоналом, Инструментом и Материалами Подрядчика, кроме случаев предоставления Материалов и/или Инструментов Заказчиком, прямо предусмотренных Договором;

Расчетный месяц - календарный месяц, в котором фактически выполнены Работы;

Регламент - Регламент по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей АО «ЦАЭК» (действующий на дату заключения Договора). Регламент является внутренним нормативным документом АО «ЦАЭК», устанавливающий обязательные требования для применения и исполнения дочерними организациями АО «ЦАЭК» и их предприятиями и организациями, привлекаемыми к планированию, подготовке, организации и производству ремонтных работ, разработке технической документации на ремонт оборудования, зданий и сооружений дочерних организаций АО «ЦАЭК» и их предприятий;

Скрытые работы - отдельные (скрываемые) виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче результата Работ Подрядчиком Заказчику, так как их качество и точность невозможно определить после выполнения последующего этапа Работ. Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по Акту освидетельствования скрытых работ до закрытия последующими видами/этапами Работами и/или конструкциями.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить Работу, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы, принять ее результат и уплатить за нее определенную Договором цену.

2.2. Риск случайного удорожания Работ несет Подрядчик.

3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Работы составляет _____ (_____) тенге, с учетом НДС 12 % - _____ тенге и определяется сметой, Приложением № 1 к Договору. Стоимость работ без учета НДС составляет _____ тенге. Допускается уменьшение цены Работ при условии неизменности качества, объемов и других условий предусмотренные настоящим договором.

3.2. Заказчик обязан уплатить Подрядчику определенную цену при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании предъявления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан, и счета на оплату.

Предъявление счета-фактуры Подрядчиком производится не позднее 7-го числа месяца, следующего за Расчетным месяцем. Счет-фактура должна содержать ссылку на номер и дату Договора, банковские реквизиты, предусмотренные Договором, полное или сокращение наименование Сторон Договора согласно официальному документу о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, а также бизнес-идентификационный номер (БИН) Сторон. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком счета-фактуры либо ненадлежащего оформления Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Работ.

Если в объеме выполненных Работ предусмотрены материалы, которые в соответствии с кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), состоят в Перечне изъятий. Подрядчик не позднее 10 календарных дней с даты совершения оборота по реализации (даты подписания накладной на отпуск запасов/Акта приемки выполненных работ), выписывает в адрес Заказчика счет-фактуру в электронной форме в соответствии с «Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур», утвержденными приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК №370 от «22» апреля 2019 года. В тексте Договора под «Перечнем изъятий» понимается перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан из третьих стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, к которым применяются пониженные ставки пошлин, а также размеров таких ставок. Перечень изъятий утверждается Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

Заказчик производит оплату по Договору 100 % по факту выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, акта о закрытии Договора и выставления Исполнителем счет-фактуры.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора и завершить в сроки согласно Графика производства работ, Приложение № 3 к Договору.

4.2. Продление срока производства Работ допускается в следующих случаях:

- 1) если Заказчиком не передан Объект/Площадка к дате начала Работ;
- 2) если имеют место обстоятельства непреодолимой силы;
- 4) в иных случаях, признанных Заказчиком объективными и требующих дополнительных сроков для выполнения Работ.

4.3. Продление сроков выполнения Работ оформляется в соответствии с п.12.2. Договора.

4.4. В случае, выявления в ходе выполнения Работ необходимости выполнения Подрядчиком дополнительных работ, стоимость которых превышает цену или увеличивает сроки выполнения Работ, Подрядчик, не вправе требовать увеличения стоимости Работ и продление сроков работ, в том числе и в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащей выполнению Работы или необходимых для этого расходов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик вправе:

- 5.1.1. самостоятельно определять способы выполнения Работ.
- 5.1.2. получить оплату в соответствии с условиями Договора.
- 5.1.3. досрочно выполнить Работы, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом.

5.1.4. привлечь к исполнению Договора других лиц (субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика, для производства не более двух третей цены Работы (цены подряда), предусмотренной Договором. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.

5.1.5. требовать от Заказчика создания безопасных условий для производства Работ на территории Заказчика.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. выполнить Работу надлежащим образом и сдать ее результаты в установленный Договором срок.

5.2.2. не позднее 3 календарных дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику списки лиц, ответственных за выполнение Работ в соответствии с Договором и обязательными для Сторон требованиями градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов, в том числе за осуществление операционного контроля, документирование его результатов и устранение выявленных недостатков и Дефектов, с предоставлением копий приказов об их назначении. Обо всех изменениях в вышеуказанном списке Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 1 рабочего дня.

5.2.3. применять при производстве Работ собственные исправные инструменты, приборы, спецмеханизмы, транспорт.

5.2.4. выполнять Работу под руководством своих инженерно-технических работников.

5.2.5. использовать все необходимые средства, имеющиеся в своем распоряжении, для сокращения отставания по срокам исполнения обязательств по Договору, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика.

5.2.6. контролировать и направлять работу Субподрядчиков, если таковые были привлечены к исполнению Договора.

5.2.7. осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех Работ по Договору.

5.2.8. самостоятельно обеспечивать защиту выполненных Работ, Оборудования, механизмов и других ресурсов, связанных с Работами, а так же принять меры по обеспечению защиты имущества Заказчика, принадлежащего ему на праве собственности, аренды, доверительного управления и на других законных основаниях, оказавшегося во владении либо пользовании Подрядчика в связи с исполнением Договора, от всех видов ущерба, повреждений; уничтожений, до полного исполнения договорных обязательств. Все указанные в настоящем пункте Договора затраты, понесенные Подрядчиком, не подлежат возмещению со стороны Заказчика. Подрядчик за свой счет осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих Дефектов, а также при непринятии мер Подрядчиком по защите имущества Заказчика, производит восполнение утраченного имущества Заказчика в результате вышеизложенного.

5.2.9. при численности задействованного на Объекте/Площадке Персонала Подрядчика 50 человек и более обеспечить присутствие в местах производства Работ инженера по охране труда и технике безопасности.

5.2.10. по первому требованию Заказчика предоставлять в течение 1 рабочего дня, если иной срок не согласован Сторонами, всю необходимую информацию и документы о ходе исполнения обязательств по Договору, в том числе для ознакомления журналы, квалификационные удостоверения о проверке знаний по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и другие запрашиваемые документы касательно охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, качества выполнения работ.

5.2.11. обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя на всех запланированных (ежедневных, еженедельных) и, при надлежащем уведомлении Заказчиком, внеплановых технических совещаниях, проводимых Заказчиком в рамках исполнения Договора. Представитель Подрядчика должен обладать полномочиями на подписание протоколов совещаний, на которых он присутствовал. Не позднее чем за 1 рабочий день до проведения планового совещания Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ (в процентном выполнении).

5.2.12. исполнять указания Заказчика по поводу выполнения Работ по Договору, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.13. обеспечить представителям Заказчика доступ на Объект/Площадку.

5.2.14. при проведении демонтажных работ оформлять акты на демонтаж.

5.2.15. обеспечить соблюдение Персоналом Подрядчика условий Договора, требований действующего законодательства Республики Казахстан, НТД, Правил, Регламента и нормативно-правовых актов, в том числе об охране окружающей среды, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм, а также требований внутренних документов Заказчика, соблюдая требования пропускного и внутриобъектового режима, правил внутреннего распорядка, документов в области интегрированной системы менеджмента (ИСМ) Заказчика.

5.2.16. оформлять и вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями, установленными НТД и указаниями Заказчика.

5.2.17. не позднее 1 календарного дня письменно (налично или факсимильной связью) уведомить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных последствий для Заказчика при выполнении его указаний о способе исполнения Работ или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают угрозу качеству, прочности результатов, выполняемых по Договору Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Неисполнение Подрядчиком обязательств по уведомлению Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, влечет утрату Подрядчиком права при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, и ссылаться на данные обстоятельства.

5.2.18. в срок не более 7 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления устранять замечания Заказчика, если иные сроки не будут установлены Заказчиком в его уведомлении или при составлении акта о дефектах и недостатках (иного документа, удостоверяющего данное обстоятельство).

5.2.19. самостоятельно и за свой счет получить и предоставить Заказчику разрешения на все собственные стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, задействованные в производстве Работ на территории Заказчика, а также обеспечить выполнение данного требования субподрядчиками. При отсутствии разрешительной документации на все собственные стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, Подрядчик/субподрядчик обязуется получить их до осуществления Работ на территории Заказчика.

5.2.20. соблюдать требования медицинского осмотра перед допуском своих работников на работы с повышенной опасностью согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

5.2.21. не позднее 5 рабочих дней направлять Заказчику информацию по принятым мерам к устранению нарушений требований безопасности и охраны труда, окружающей среды, выявленных Заказчиком или органами надзора и контроля, и предъявленных Подрядчику в виде писем, замечаний, или озвученных на совещаниях.

5.2.22. не позднее 2 календарных дней до предстоящей даты проведения процедур освидетельствования Скрытых работ, а также промежуточной сдачи отдельных Работ, письменно уведомлять об этом Заказчика, а также в случае обоснованной неявки представителей Заказчика, обеспечивать повторный документированный вызов.

5.2.23. произвести замену работника в течение 24 часов по обоснованному требованию Заказчика.

5.2.24. обеспечить прохождение Персоналом Подрядчика до начала Работ вводного инструктажа по безопасности и охране труда, проводимого представителями Заказчика.

5.2.25. поддерживать чистоту и порядок в местах производства Работ, подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Производить отсортировку остатков материалов, собирать отходы в места сбора, указанные ответственным персоналом Заказчика и ежедневно удалять с территории Объекта все отходы из мест их сбора в места их временного хранения.

5.2.26. полностью отвечать за соблюдение Персоналом Подрядчика действующих норм и требований: по технике безопасности и правилам производства работ, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, промышленной безопасности, земельного законодательства, специальных требований предприятий – владельцев инженерных коммуникаций и других специальных требований в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2.27. нести ответственность, гарантировать возмещение расходов и ограждать Заказчика от обязательств, претензий, судебных разбирательств, убытков, в связи или в результате:

- травмы, заболевания или смерти Персонала Подрядчика или третьих лиц, вызванных прямо или косвенно выполнением Работ, и/или потерю, убытки или ущерб их собственности, имуществу, в том числе вызванных умышленным нарушением или грубой неосторожностью Персонала Подрядчика, а также непосредственно Подрядчика;
- любых платежей, требуемых государственными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами, которые не являются возмещаемыми по Договору, и которые необходимы для удовлетворения любых претензий, требований, убытка последних, вызванных виновными действиями/бездействиями Подрядчика/Субподрядчика;
- нарушения Подрядчиком действующего законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов Заказчика, с которыми ознакомлен Подрядчик;
- нарушения Подрядчиком прав третьих лиц, связанных с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности;
- допуска к выполнению Работ Персонала Подрядчика, не отвечающего установленным законодательством Республики Казахстан требованиям, включая квалификацию, а также не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющего соответствующий допуск к Работам;
- повреждения, вызванные виновными действиями/бездействиями Персонала Подрядчика, действующих подземных, надземных и иных коммуникаций и сооружений в соответствии с предписаниями организаций, эксплуатирующих данные коммуникации и сооружения, а также в соответствии с нормами и требованиями государственных нормативных документов.

5.2.28. бережно относиться к имуществу и документации, пропускам Заказчика, переданным Подрядчику в пользование на период выполнения Работ, обеспечить их целостность и сохранность, а также обеспечить незамедлительный их возврат Заказчику после завершения Работ или в случаях расторжения Договора либо истечения срока его действия. При неосуществлении возврата, возместить Заказчику их стоимость в течение 5 рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета.

5.2.29. обеспечить выполнение Работ Персоналом Подрядчика соответствующей квалификации, подтвержденной соответствующими документами.

5.2.30. обеспечить за свой счет Персонал Подрядчика средствами индивидуальной защиты с логотипом Подрядчика/Субподрядчика.

5.2.31. не допускать посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющего отношения к выполнению Работ на Объекте/Площадке.

5.2.32. не допускать вывешивание плакатов на рабочих местах и на территории Площадки, за исключением тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место для Подрядчика. По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с графиком, со схемами строповки узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда.

5.2.33. не допускать Персонал Подрядчика, находящегося на территории Заказчика, на рабочее место при обнаружении факта употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств и/или в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикологического опьянения (их аналогов).

Не допускать употребление на территории Заказчика алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств, курение на рабочих местах, за исключением мест, специально отведенных для курения.

При обнаружении Персонала Подрядчика на территории Заказчика факта употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств и/или в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикологического опьянения (их аналогов) Заказчик незамедлительно вызывает уполномоченного представителя Подрядчика и проводит обследование в наркологическом диспансере.

Затраты Заказчика, связанные с медицинским освидетельствованием, при подтверждении фактов употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств и/или нахождения работников Подрядчика в вышеуказанном состоянии, возмещает Подрядчик.

5.2.34. незамедлительно сообщать Заказчику о происшедших несчастных случаях и авариях, а также вести расследование несчастных случаев с участием ответственного представителя Заказчика. Если в результате несчастного случая, произошедшего по вине Подрядчика/Субподрядчика, выполнение Работ будет приостановлено уполномоченными государственными органами, все убытки Заказчика, понесенные в результате такой приостановки, будут отнесены на счет Подрядчика.

5.2.35. соблюдать требования, предусмотренные Приложением № 7 к договору «Обязательные условия безопасного производства работ».

5.2.36. согласовывать с Заказчиком вопрос о целесообразности дальнейшего использования Заказчиком демонтированного Подрядчиком оборудования/материалов Заказчика. В случае, если Заказчик планирует использовать демонтируемое оборудование/ материалы, Подрядчик обязан обеспечить при демонтаже целостность и сохранность оборудования/материалов до момента их передачи Заказчику.

5.2.37. осуществлять транспортировку и размещение демонтированного оборудования/материалов в специально отведенном для складирования месте, указанном Заказчиком;

5.2.38. не позднее 3 рабочих дней письменно уведомлять Заказчика о смене адреса, телефонов, банковских реквизитов и иных данных, имеющих существенное значение для взаиморасчетов и переписки. Все действия, совершенные по старым реквизитам и адресам, в случае несвоевременного уведомления будут исполненными надлежащим образом.

5.2.39. При выполнении по договору строительного подряда работ предоставлять лицу, осуществляющему технический надзор надлежаще оформленную исполнительную документацию, журналы, акты освидетельствования скрытых работ, и другую необходимую документацию, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

5.2.40. По окончании выполнения по договору строительного подряда работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта, предоставлять сопроводительным письмом Заказчику, с Актом выполненных работ, декларацию о соответствии в 4 (четыре) экземплярах, комплект исполнительной технической документации с подписями всех ответственных за сдачу-приемку лиц, в том числе с подписями экспертов авторского и технического надзоров, а также на электронном и бумажном носителях контрольно-исполнительную топосъемку с отметкой о внесении в базу данных Северо-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик вправе:

- 6.1.1. иметь беспрепятственный доступ к Объекту, месту выполнения Работ, а также доступ к Материалам с целью их проверки на соответствие по количеству и качеству.
- 6.1.2. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, за соблюдением сроков их выполнения, правильностью использования Подрядчиком Материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- 6.1.3. давать указания, в том числе о приостановлении Работ, если Подрядчик своими действиями вызывает угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, нарушение или угрозу нарушения технологии Работ, либо нарушает условия Договора, требования нормативно-правовых актов, НТД либо расторгнуть Договор, если Подрядчик не принимает меры к устранению нарушений. Возобновление Работ и допуск отстраненного Персонала Подрядчика осуществляется по письменному обращению Подрядчика с указанием принятых мер по устранению нарушений.
- 6.1.4. запрашивать у Подрядчика необходимую документацию и информацию по выполнению Работ.
- 6.1.5. принять меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка, чистоты на Площадке/Объекте и не соблюдения требований Правил, Регламента, НТД. Работа считается непринятой Заказчиком до тех пор, пока Площадка/Объект, где производились Работы Подрядчиком, не будут убраны.
- 6.1.6. по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в состав и объем выполняемых Подрядчиком по Договору Работ, с последующим оформлением протокола замены, согласованный экспертами технического и авторского надзора.
- 6.1.7. в случае оставления Подрядчиком имущества на Объекте или прилегающей к ней территории на срок более 10 календарных дней с даты завершения Работ или расторжения Договора, и не принятия Подрядчиком мер по вывозу своего имущества в течение 2 календарных дней после получения письменного уведомления Заказчика, осуществить вывоз указанного имущества на другую территорию, не неся при этом ответственности за сохранность и целостность имущества. Вывоз имущества Подрядчика и образовавшегося в результате его Работы мусора осуществляется за счет Подрядчика.
- 6.1.8. в любое время до сдачи ему Работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора.

6.2. Заказчик обязан:

- 6.2.1. создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы.
- 6.2.2. принять результат Работы при отсутствии мотивированных возражений.
- 6.2.3. уплатить Подрядчику цену Работы в соответствии с условиями Договора.
- 6.2.4. до начала Работ ознакомить Подрядчика со своими внутренними документами, требованиями которых необходимо соблюдать Подрядчику при исполнении Договора.
- 6.2.5. обеспечить соблюдение персоналом Заказчика условий Договора, требования действующего законодательства Республики Казахстан, НТД, Правил, Регламента.
- 6.2.6. заблаговременно извещать Подрядчика о дате, времени и месте проведения технических совещаний по выполнению Работ на Объекте, в рамках выполнения обязательств по Договору.
- 6.2.7. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступление от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует, что на момент подписания Договора ознакомлен с особенностями Объекта, условиями выполнения Работ на нем, с содержанием Договора, ПСД и любыми другими документами и требованиями, предоставленными Заказчиком, получил и учел любую дополнительную информацию, а также хорошо изучил условия, при которых предстоит выполнить весь объем Работ и факторы, которые могут повлиять на выполнение обязательств по Договору, оценил корректность и адекватность цены Работы.

7.2. Подрядчик гарантирует:

- наличие у него разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для выполнения Работ;
- применение им Оборудования и других технических устройств, соответствующих современным научно-техническим технологиям, санитарно-техническим требованиям, в исправном состоянии, имеющих технические паспорта и/или другую документацию, допущенных к применению согласно действующему законодательству Республики Казахстан;
- выполнение Работ без Дефектов, снижающих их качество;
- соответствие состава Работ требованиям НТД;
- возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором в течении гарантийного срока;

7.3. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 календарных месяца со дня подписания Сторонами акта выполненных работ. Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи допустимого износа или порчи Оборудования по вине Заказчика, при его нормальной эксплуатации. Гарантии на

используемые при производстве Работ Материалы Подрядчика устанавливаются в соответствии с их сертификатами (паспортами) качества, но не могут быть менее гарантийного срока, предусмотренного п.7.3. Договора.

7.4. Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи Оборудования при его нормальной эксплуатации. Гарантии на используемые при производстве Работ Материалы Подрядчика устанавливаются в соответствии с их сертификатами (паспортами) качества, но не могут быть менее гарантийного срока, предусмотренного п.7.3. Договора.

7.5. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет осуществлять исправление Дефектов, возникших в результате некачественных Работ Подрядчика, в сроки, указанные в уведомлении Заказчика, в соответствии со статьей 10 Договора.

7.6. Гарантийный срок, установленный п.7.3. Договора, продлевается на период устранения Дефектов (промежуток времени с момента обнаружения Дефекта и до его устранения).

8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ

8.1. Для производства Работ Подрядчик использует Материалы Заказчика.

Подрядчик вправе при производстве Работ применять собственные прочие материалы, общая стоимость которых не должна превышать их размер, установленный сметой, являющейся неотъемлемой частью Договора.

8.2. Заказчик производит отпуск Материалов представителю Подрядчика, полномочия которого должны быть оформлены надлежащей доверенностью на получение Материалов. Передача Материалов производится с обязательным оформлением нижеуказанных документов, которые подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон: накладной на отпуск материалов со склада цеха в работу, оформляемой по форме согласно Приложению № 9; акта приема-передачи, оформляемого по форме согласно Приложению № 10. Основанием для отпуска материалов Подрядчику является перечень материалов, необходимых для выполнения Работ, подписанный уполномоченным лицом Заказчика.

8.3. Вывоз Материалов за пределы территории Заказчика и ввоз Материалов на территорию Заказчика производится по письменной заявке Подрядчика с соблюдением пропускного и внутриобъектового режима, действующего на предприятии Заказчика.

8.4. Подрядчик до наступления сроков сдачи результатов Работ несет риск случайного повреждения, утраты Материалов Заказчика - с момента получения их от Заказчика в порядке, предусмотренном п.8.2. Договора.

8.5. Подрядчик ежемесячно со сдачей Акта приемки выполненных работ предоставляет уполномоченному представителю Заказчика полный отчет по использованным материалам. Отчет по использованным материалам формируется из АСУПФиА «Ellipse», (последнее предложение отражается при наличии рабочих мест подрядчика в АСУПФиА «Ellipse»).

8.6. Возврат не использованных Материалов после выполнения Работ Подрядчик производит согласно Регламенту об использовании и выдаче материально-производственных запасов со складов отдела материально-технического снабжения и со складов структурных подразделений предприятий Заказчика.

8.7. В случае невозврата полученных Подрядчиком, но не использованных Материалов, Заказчик вправе удержать их стоимость с причитающихся Подрядчику платежей.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи Работ и направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ, формируемый в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, подписанный со своей стороны, экспертами технического и авторского надзора и скрепленный оттиском печати. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, к Акту приемки выполненных работ должна быть оформлена справка о стоимости выполненных работ и затрат.

При продолжительности выполнения Работ более одного месяца, Акты приемки выполненных работ направляются ежемесячно в период с 20 по 25 число Расчетного месяца по форме согласно Приложению № 11.

9.2. К Акту выполненных работ должны быть приложены: декларация о соответствии в 4 (четыре) экземплярах, комплект исполнительно-технической документации с подписями всех ответственных за сдачу-приемку лиц, в том числе с подписями экспертов авторского и технического надзоров, на электронном и бумажном носителях контрольно-исполнительную топосъемку с отметкой о внесении в базу данных Северо-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр», ведомость потребных ресурсов, перечень использованных в Расчетном месяце Материалов, с указанием их сметной стоимости, сертификаты (паспорта) качества, а также информацию о количестве отходов, образованных в Расчетном месяце.

9.3. При необходимости проведения испытаний выполненных Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком срок проведения таких испытаний. Приемка результатов Работы осуществляется только при положительном результате испытаний.

9.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней производит приемку выполненных Работ путем подписания Акта приемки выполненных работ и скрепления оттиском печати либо, в случае обнаружения дефектов в Работе или замечаний к Акту, в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ, с указанием сроков для устранения выявленных замечаний.

9.5. Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа обязан устранить указанные дефекты и/или замечания. После их устранения, направить Заказчику Акт приемки выполненных работ для повторного рассмотрения.

9.6. При подписании Актов приемки выполненных работ Заказчик вправе исключить затраты на использование своих машин и подъемных механизмов, а также стоимость предоставляемых Подрядчику ресурсов (электроэнергию, воду, пар, сжатый воздух и др.), если таковые предусмотрены сметной документацией и/или подтверждены актом, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

9.7. Акт о закрытии Договора направляется Подрядчиком после надлежащего завершения всего объема Работ, выполнения всех условий Договора и оформляется в порядке и сроки, предусмотренные п.9.4. Договора.

10. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

10.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых Дефектах, обнаруженных в течение срока действия Договора, с указанием срока исправления Дефектов.

10.2. При получении от Заказчика извещения о выявлении Дефектов и недостатков Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта о дефектах и недостатках. При этом, в случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика на Площадке, промежуток времени между уведомлением Заказчика и датой проведения комиссионного обследования не может быть менее 2 календарных дней.

10.3. После оформления акта о дефектах и недостатках, Подрядчик обязан за свой счет устранить Дефекты, возникшие в результате некачественных Работ Подрядчика, в течение периода времени, указанного Заказчиком, но не менее необходимого периода времени для устранения таких Дефектов.

10.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин, выраженного в отказе Подрядчика от подписания акта о дефектах и недостатках (иного документа, подтверждающего данное обстоятельство) или от участия в его составлении либо, если Подрядчик не может или не хочет устранить Дефект (привести Работу в соответствие с проектно-сметной или другой технической документацией) в установленный Заказчиком срок, Заказчик составляет и подписывает односторонний акт. Приемка таких Работ производится на основании указанного акта либо на основании заключения экспертизы, проведенной по требованию и за счет Подрядчика.

10.5. Не обоснованный отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов. При этом ответственность за нарушение общего срока выполнения Работ несет Подрядчик.

10.6. Уведомление Заказчика о назначении экспертизы должно быть предоставлено Подрядчиком в течение 3 календарных дней с момента уведомления последнего Заказчиком о выявленных дефектах или недостатках.

10.7. В случае отказа Подрядчика в предоставлении заключения экспертизы либо не предоставления им уведомления о назначении экспертизы, как это указано в п.10.6. Договора, Заказчик вправе назначить независимую экспертизу. При установлении вины Подрядчика расходы Заказчика по экспертизе подлежат возмещению Подрядчиком.

10.8. Заказчик вправе устранить Дефекты своими силами и средствами либо путем привлечения третьих лиц. Стоимость затрат Заказчика, связанных с устранением Дефектов, допущенных Подрядчиком, удерживается из суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств в течение 5 рабочих дней с даты предъявления Заказчиком счета на оплату.

10.9. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работы третьему лицу за счет Подрядчика (в порядке, предусмотренном п.10.8. Договора), а также потребовать возмещения убытков.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За нарушение Подрядчиком условий Договора Подрядчик возмещает Заказчику причиненные указанными нарушениями убытки, возникшие по вине Подрядчика.

11.2. За нарушение по вине Подрядчика сроков выполнения Работ (начальных, промежуточных и конечных), сроков устранения Дефектов Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости невыполненных/дефектных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных/дефектных Работ.

11.3. За ненадлежащие результаты Работы (в том числе, отступления от Договора, ненадлежащее качество работы), если они не вызваны недостатками в предоставленных Заказчиком материалах и/или оборудовании, которые не могли быть обнаружены Подрядчиком при надлежащей приемке указанных

материалов и/или оборудования, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от цены Работ, выполненных с ненадлежащим качеством. Штраф уплачивается вне зависимости от начисления неустойки, предусмотренной п.11.2. Договора, и/или применения ответственности по правилам об ответственности подрядчика за ненадлежащее качество работы, предусмотренной статьей 635 ГК РК.

11.4. За нарушение по вине Заказчика сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.

11.5. Подрядчик производит возврат уплаченных Заказчиком денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования или истечения срока действия/расторжения Договора (в зависимости от события, которое наступит ранее), в случае не выполнения Работ – возврат производится в полном объеме; в случае выполнения Работ на сумму меньше, чем сумма произведенной оплаты, Подрядчик производит возврат разницы между произведенной оплатой и ценой выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

11.6. За нарушение срока возврата денежных средств Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно возвращенных денежных средств за каждый день просрочки до дня фактического возврата Подрядчиком денежных средств вне зависимости от срока действия Договора.

В отсутствие приемки выполненных Работ в установленный Договором срок неустойка начисляется со дня получения Подрядчиком суммы оплаты. В случае частичного выполнения Работ неустойка начисляется со дня, следующего за днем истечения срока возврата денежных средств, установленного п.11.5. Договора.

11.7. За нарушение Подрядчиком (Персоналом Подрядчика) требований по охране окружающей среды, безопасному ведению работ, правил техники безопасности, промышленной безопасности, санитарии или иных правил охраны труда, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере установленного, Приложением № 7 к договору «Обязательные условия безопасного производства работ». Нарушения фиксируются представителем Заказчика в день их выявления с оформлением документа «Указания по безопасности и охране труда» согласно Приложению № 8 к Договору, который вручается представителю Подрядчика под роспись.

11.8. При досрочном расторжении Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от цены Работ, сверх неустойки, предусмотренной вышестоящими пунктами Договора.

11.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Казахстан. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору (непреодолимая сила: стихийные бедствия, военные действия), обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.10. Уплата неустойки, штрафа, возмещение убытков производится по письменному требованию Сторон и не освобождает Стороны от исполнения ими принятых обязательств по Договору.

11.11. Взыскание Сторонами неустойки, наряду с другими способами обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных Договором или законодательством, является правом, а не обязанностью Сторон.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2020 г., а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств.

12.2. Изменения к Договору имеют силу, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттиском печатей Сторон.

12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.4. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

12.5. Односторонний отказ от Договора допускается по инициативе Заказчика, в случаях:

- 1) нарушения Подрядчиком условий Договора, признаваемых Заказчиком существенными;
- 2) аннулирование или отзыв лицензии или иного разрешающего документа, издание актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ, предусмотренных Договором;
- 3) если Заказчик располагает сведениями о нахождении Подрядчика на стадии банкротства или ликвидации, либо в отношении Подрядчика установлена процедура реабилитации;

- 4) продолжения более 1-го месяца обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора;
- 5) в случае недостаточности у Заказчика денежных средств для исполнения обязательств по Договору;
- 6) допущения в течение 1-го календарного года несчастного случая с работником Подрядчика/Субподрядчика, при исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору или по иным договорам, заключенным с ним.
- 7) принятия решения Заказчиком о нецелесообразности исполнения Договора.
- 8) в иных случаях, предусмотренных законодательством и Договором.

В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчик обязан предупредить об этом Подрядчика не позднее чем за 10 календарных дней до даты прекращения договора путем направления уведомления.

В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчик обязан уплатить Подрядчику за работы, выполненные до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, если эти работы выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком по Акту приемки выполненных работ, без возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением Договора.

12.6. При наступлении случаев, предусмотренных п.12.5. Договора, Подрядчик:

- 1) немедленно прекращает Работы и обеспечивает консервацию Объекта в соответствии с НТД.
- 2) вывозит с территории Заказчика свое имущество и неиспользованные Материалы, либо, если Заказчик оставляет Материалы для дальнейшего применения в своих нуждах, передает их Заказчику по акту приема-передачи. Сторонами стоимость Материалов определяется по финансовым документам и оговаривается порядок их оплаты.
- 3) несет полную материальную ответственность за сохранность результатов Работ до момента передачи его по акту приема-передачи Заказчику.

12.7. При расторжении Договора в связи с нарушением Подрядчиком его условий, Заказчик удерживает из суммы, подлежащей выплате Подрядчику, издержки Заказчика на поиск нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанная с отказом от Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику Подрядчиком в течение 5 рабочих дней.

12.8. Расторжение Договора либо истечение срока его действия не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и Договором, за нарушения, допущенные в ходе исполнения Договора.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ

13.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, что иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работникам Заказчика или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству Республики Казахстан, а также Подрядчик гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции.

13.2. Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Заказчика обязательство компенсировать Подрядчику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п.13.1.

13.3. Нарушение Подрядчиком любого обязательства, указанного в п.13.1, может быть рассмотрено Заказчиком как существенное нарушение условий настоящего Договора, предоставляющее Заказчику право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущерба любым иным правам или средствам защиты Заказчика согласно настоящему Договору или применимому законодательству. В случае нарушения Подрядчиком п.13.1 Договора, Подрядчик принимает на себя обязательство оградить Заказчика от любых требований и возместить Заказчику все убытки, которые могут возникнуть у Заказчика в связи с любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего Договора.

13.4. Подрядчик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противодействию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Заказчика. В случае нарушения Политики сотрудниками Заказчика, Подрядчик обязуется направить письменное уведомление об этом по линии связи, указанной в п.13.5 Договора.

13.5. Заказчиком установлены следующие линии связи, позволяющие Подрядчику и его работникам сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:

Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал (<http://caepco.kz>);

Телефон: +7 (727) 259-66-40;

Электронная почта: info@energy.kz.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора и/или в связи с ним не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в установленном законодательством порядке по месту нахождения Заказчика.

14.2. Досудебный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным для Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 рабочих дней с даты ее получения.

14.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют свою силу, если они противоречат условиям Договора.

14.4. В случае выявления противоречий положений внутренних документов Заказчика условиям Договора, Стороны руководствуются условиями Договора.

14.5. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо приложения к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритет имеет текст соответствующего приложения.

14.6. В случае если какое-либо условие Договора противоречит любому условию Договора условие, в котором предусматривается более требовательное обязательство Подрядчика, имеет преимущественную силу.

14.7. Недействительность или невозможность исполнения любой части Договора, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором, не ограничивает и не влияет на действительность или возможность исполнения остальных частей Договора.

14.8. Все ссылки, содержащиеся в настоящем Договоре, на договоры, соглашения или другие документы, означают такие договоры, соглашения или документы, с учетом возможных периодических исправлений, дополнений или изменений, в соответствии с их условиями.

14.9. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

14.10. Лица, подписавшие Договор, подтверждают, что имеют все необходимые полномочия для подписания Договора по учредительным документам и законодательству, а также не требуется согласия (в том числе последующего) учредителей, участников, акционеров и иных органов Сторон для заключения Договора.

14.11. Текст Договора, включая приложения к нему, а также весь объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, когда передача информации требуется для надлежащего исполнения Договора.

14.12. Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченных представителей Сторон, путем факсимильной, почтовой связи заказными письмами, путем личного вручения под роспись. В целях координации исполнения условий Договора Стороны могут использовать иные средства связи: телефонную, посредством электронной почты, однако подобные сообщения в качестве официальных уведомлений рассматриваться не будут. Если письмо (уведомление, претензия) не удастся Заказчику отправить Подрядчику по адресу, указанному в Договоре, данное письмо считается врученным Подрядчику по истечении 10 календарных дней с даты отправки указанного письма почтовым сообщением по последнему известному Заказчику местонахождению Подрядчика или юридическому адресу Подрядчика, указанному в Договоре.

14.13. Письменная корреспонденция по исполнению Договора, за исключением претензий и сопроводительных писем к Актам выполненных работ, для рассмотрения которых условиями Договора предусмотрены иные сроки, должна рассматриваться каждой из Сторон в течение 5 рабочих дней с даты получения письма от другой Стороны по Договору.

14.14. При обмене подписанными экземплярами Договора, дополнительных соглашений и иной документации посредством факсимильной связи или средств интернета (электронная почта), Стороны принимают их к исполнению. Сторона, направившая по факсу или электронной почте какой-либо документ, обязана в течение 5 последующих рабочих дней направить оригинал соответствующего документа другой Стороне таким видом связи, чтоб документ был получен адресатом не позднее 20 календарных дней с момента его отправки.

14.15. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.16. На момент подписания Договора неотъемлемой его частью являются следующие приложения:

Приложение № 1. Смета.

Приложение № 2. Перечень видов Работ (Техническое задание).

Приложение № 3. График производства Работ.

Приложение № 4. Форма документа «Перечень внутренних документов Заказчика».

Приложение № 5. Форма документа «Порядок производства строительно-монтажных работ»

Приложение № 6. Форма документа «Обязательные условия безопасного производства Работ».
Приложение № 7. Форма документа «Указания по безопасности и охране труда».
Приложение № 8. Форма документа «Накладная на отпуск материалов со склада цеха в работу».
Приложение № 9. Форма документа «Акт приема-передачи ТМЦ».
Приложение № 10. Форма документа «Акт приемки выполненных работ»
Приложение № 11. Форма документа «Акт о закрытии договора».

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Подрядчик»

«Заказчик»

АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая Компания»
Республика Казахстан
150000, СКО, г. Петропавловск
ул. А. Шажимбаева, 144
ИИК KZ61914398558BC00239
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск
БИК SABRKZKA
КБЕ 17
БИН 990140000196
Свидетельство по НДС серия 48001
№ 0004662 от 22.08.2012г.

Генеральный директор

_____ А.А. Казаповский

Заказчик АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме _____ тыс.тенге
в том числе: _____ тыс.тенге
налог на добавленную стоимость _____ тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная», СКО, Мамлютский район

Составлен в ценах

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Подрядчик

Заказчик
АО "Северо-Казахстанская Распределительная
Электросетевая Компания"
Генеральный директор

А.А. Казановский

Техническое задание
Строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная», СКО, Мамлютский район

№ п/ п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Земляные работы для установки металлических опор				
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2000
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60,972
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1955
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,972
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2015,972
8	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированн ой поверхности за проход бульдозера	136
Установка металлических опор				
9	1133-0104-0111 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка (У110-1+5-3 шт)	т	20,598
10	Е11-330104-0110 1133-0104-0110 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка (У110-5-2шт)	т	7,474
11	1133-0104-0111 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка У110-1 (2 шт)	т	9,792
12	Е11-330104-0111 1133-0104-0111 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка (У110-1+9-4шт)	т	32,56

Монтаж ж/бетонных опор				
13	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	275
14	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован УБ110-11	м3	57,72
15		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями (траверсы). Монтаж.	т	32,519
16	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован ПУСБ110- 11	м3	11,52
17		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями (металлоконструкции к опоре ПУСБ110-11) (траверсы). Монтаж.	т	2,776
18	1133-0103-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован ПБ110-15	м3	243,84
19		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями (металлоконструкции к опоре ПБ110-15) (траверсы). Монтаж.	т	55,5093
20	1133-0103-0102 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован ПСБ110-1	м3	12,5
21		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями (металлоконструкции к опоре ПСБ110-1) (траверсы). Монтаж.	т	1,42
Монтаж ж/бетонных фундаментов				
22	1108-0101- 0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,55
23	1133-0107- 0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка (ФЗ-Ам-20 шт)	м3 сборных железобетонн ых конструкций	34
24	1133-0203- 0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	90
25	1133-0107- 0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка АР-5 (64 шт)	м3 сборных железобетонн ых конструкций	12,8
26	1133-0107- 0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка Р1-А (20 шт)	м3 сборных железобетонн ых конструкций	4
27	1133-0203- 0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	204
Гидроизоляция жб изделий				

28	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	2430,24
29	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	2430,24
Заземление				
30	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	122
31	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м (существ. опор)	1 заземлитель	22
Пересечения				
32	1133-0105-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 110 кВ (3 провода). Подвеска	переход	3
33	1133-0105-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1
34	1133-0105-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 и 110 кВ (3 провода). Подвеска	переход	5
Подвеска проводов				
35	1133-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм ² . Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	29,057
36	1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	29,057
37	С124-040106-0117 2404-0106-0117 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93. Подвеска.	шт.	3157
38	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93. Подвеска.	шт.	7151
39	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98. Монтаж.	шт.	900
40	2404-0201-0405 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2В ГОСТ Р 51177-2017. Монтаж.	шт.	107
41	2404-0205-0309 РСНБ РК 2015	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-400/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-2017. Монтаж.	шт.	762
42	2404-0205-0303 РСНБ РК 2015	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-2017. Монтаж.	шт.	254
Закрепление стоек в грунте				

43	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	173
44	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6863,1
45	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слой подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ его слоя	28,2

«Подрядчик»

«Заказчик»

АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая
Компания»

Генеральный директор

_____ А.А. Казановский

График производства Работ

№ п/ п	Мероприятие	2020 год		Примечание
		Ноябрь	Декабрь	
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				

Подрядчик

Заказчик

А.А.Казановский

Перечень внутренних документов Заказчика

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1.	Политика АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в области качества, экологии, профессиональной безопасности и здоровья	Введена в действие приказом № 8 от 05.01.2017г.
2.	Регламент о соблюдении основных требований техники безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и экологического законодательства на территории АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»	РГ 03.038/01 от 08.09.2015г.
3.	IMS 04.04 Управление эмиссиями	Утверждён 14.09.2017г.

Подписанием настоящего Приложения к Договору Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с содержанием вышеперечисленных внутренних документов Заказчика и обязуется:

1. при выполнении Работ неукоснительно соблюдать требования данных документов в части, не противоречащей условиям Договора;
2. произвести ознакомление Персонала Подрядчика с вышеперечисленными документами;
3. нести ответственность за нарушение требований внутренних документов Заказчика в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Республики Казахстан.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Порядок производства строительно-монтажных работ

Началом выполнения Работ является дата передачи Площадки Заказчиком Подрядчику с оформлением соответствующего акта.

Датой окончания Работ является дата подписания Заказчиком акта о приемке построенного объекта в эксплуатацию/акта выполненных работ с учетом промежуточных актов выполненных работ, сумма которых будет эквивалентна сумме договора.

Стороны в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 за 15 календарных дней до начала Работ осуществляют следующие действия:

- Подрядчик назначает ответственного производителя Работ с обязательным письменным уведомлением Заказчика о назначении производителя Работ;

Указанные должностные лица обязаны иметь соответствующее разрешение, согласно требованиям действующего законодательства, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

- Подрядчик до начала любых Работ ограждает Площадку и опасные зоны Работ за ее пределами в соответствии с требованиями НТД;

- Подрядчик определяет состав бригад для выполнения Работ по численности и квалификации.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить на утверждение техническому руководителю Заказчика организационно-техническую документацию (проект организации строительства, проект производства работ и иные документы, в которых содержатся решения по организации строительства и технологии производства работ), оформленные в соответствии со СН РК 1.03-00-2011;

Запрещается производство строительно-монтажных работ без утвержденной организационно-технической документации.

В течение 5 рабочих дней с даты начала Работ Заказчик при необходимости передает в пользование Подрядчику по акту здания и сооружения, необходимые для осуществления Работ по Договору, обеспечивает временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода.

Подрядчик в соответствии с действующей НТД производит расчистку Площадки и подготовку её к застройке.

Подрядчик за свой счет обеспечивает вынос на площадку геодезической разбивочной основы;

Подрядчик обязан подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров, после чего предоставить на утверждение Заказчику акт разбивки на местности;

Подрядчик в период производства Работ осуществляет уборку территории Площадки и пятиметровой прилегающей зоны, своевременно вывозит бытовой и строительный мусор, в порядке, установленном НТД и внутренними нормативными документами Заказчика.

Выполнение Работ Подрядчик должен производить в строгом соответствии с ПСД и организационно-технической документацией.

В течение срока выполнения Работ ответственные представители Заказчика с привлечением представителей Подрядчика, являющихся производителями работ по Договору:

- выполняют операционный контроль с целью выявления Дефектов в ходе выполнения производственных процессов и операций;

- определяют по результатам операционного контроля необходимость выполнения запланированных и дополнительных объемов работ;

- результаты операционного контроля и сведения об устранении выявленных контролем дефектов документируются в общем журнале работ;

- с целью выявления скрытых Работ проводят промежуточную оценку соответствия, которая выполняется в форме освидетельствования результатов работ, скрываемых последующими работами. Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций должны производиться в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011;

— не позднее 2 рабочих дней от даты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика подписываются соответственно акт промежуточной приемки ответственных конструкций и акт освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011.

«Подрядчик»

«Заказчик»
АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая
Компания»

Генеральный директор

_____ А.А. Казановский

Обязательные условия безопасного производства работ

1. Общие требования по безопасности охраны труда и охраны окружающей среды

1.1. Подрядчик и Персонал Подрядчика обязаны:

- 1.1.1. Соблюдать требования отраслевых Правил техники безопасности (ПТБ), Правил пожарной безопасности (ППБ), Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правила устройства электроустановок (ПУЭ), а также требований промышленной безопасности, охраны труда, трудового и экологического законодательства Республики Казахстан..
 - 1.1.2. Ознакомиться и соблюдать, при проведении Работ на Площадке и нахождении на территории Заказчика требования применимых инструкций и правил Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области охраны окружающей среды.
 - 1.1.3. Иметь при себе на Площадке/территории Заказчика пропуск, удостоверение по технике безопасности, квалификационное удостоверение.
 - 1.1.4. Использовать при проведении Работ исправный проверенный инструмент, приспособления и другую рабочую оснастку.
 - 1.1.5. Передвигаться по Площадке/территории Заказчика по указанным оперативным дежурным персоналом Заказчика маршрутам.
 - 1.1.6. Использовать при проведении Работ необходимые средства индивидуальной и коллективной защиты.
 - 1.1.7. Строго соблюдать меры безопасности при проведении Работ, указанные в наряде, распоряжении и анализе безопасности работ (АБР) Заказчика.
 - 1.1.8. Выполнять все требования оперативного дежурного персонала и кураторов Заказчика, закреплённых за Персоналом Подрядчика.
 - 1.1.9. Ежедневно по окончании Работ производить уборку Площадки.
 - 1.1.10. Предъявлять по требованию специалистов службы безопасности Заказчика для осмотра ручную и любую другую кладь.
 - 1.1.11. Пройти вводное обучение Заказчика по технике безопасности и охране окружающей среды - «Требования безопасности компании АО «ЦАЭК», действующие на дату заключения Договора (далее - «Вводное Обучение»), общей продолжительностью 8 (восемь) часов, проводимое центром обучения, утвержденным Заказчиком и сдать экзамен в виде тестирования. Вводное Обучение для Персонала Подрядчика проводится в помещении центра обучения или Заказчика по предварительному уведомлению Подрядчика Заказчиком. По результатам Вводного Обучения, при условии успешной сдачи экзамена (тестирования), Персоналу Подрядчика выдается сертификат об успешном прохождении Вводного Обучения со сроком действия 1 (один) год и такой Персонал Подрядчика допускается для выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика. Вводное Обучение обязательно для всего Персонала Подрядчика, выполняющего работы высокого и среднего риска. Вводное обучение проводится для Персонала Подрядчика перед началом выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика, и в последующем ежегодно в случае, если Работы предусмотрены на срок, превышающий 1 (один) год. При допуске к выполнению Работ нового Персонала Подрядчика, не проходившего Вводное обучение перед началом выполнения Работ на объектах Заказчика либо срок действия сертификата которого истек на этот момент, Вводное обучение проводится для нового Персонала Подрядчика в соответствии с настоящим пунктом.
 - 1.1.12. Подрядчик должен обеспечить присутствие/участие на проводимых Заказчиком ежемесячных собраниях по охране труда, технике безопасности и охраны окружающей среды Персонала Подрядчика в объеме 100% задействованного в производстве Работ персонала в день проведения собрания. Материалы для дополнительного внутреннего обучения Подрядчик может получить у специалистов по технике безопасности Заказчика. Место обучения Подрядчик определяет по согласованию со специалистами по технике безопасности Заказчика.
 - 1.1.13. Подавать заявку Заказчику и получать его согласование на проведение работ по критическому поднятию и перемещению грузов, в соответствии с требованиями, предусмотренными в применимой инструкции Заказчика.
 - 1.1.14. Подрядчик обязан обеспечить нахождение инженера по охране труда и технике безопасности или квалифицированного инженерно-технического работника на месте производства Работ на Площадке/территории Заказчика, при численности Персонала Подрядчика 50 и более человек.
- ##### 1.2. Подрядчику и Персоналу Подрядчика запрещается:

1.2.1. Находиться на Площадке/территории Заказчика без средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые обязательны к ношению, в соответствии с действующими политиками и процедурами Заказчика по безопасности. К таким СИЗ относятся как стандартные СИЗ (каска, защитные очки, специальная одежда, обувь с металлическим/композитным подноском), так и СИЗ, необходимые для выполнения определенной работы (в соответствии с характером выполняемой работы и опасностями, имеющимися на Площадке). Общие обязательные требования к специальной одежде предусмотрены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

1.2.2. Находиться на Площадке/территории Заказчика, будучи употребившим психоактивное вещество, или в состоянии любого опьянения. Представитель Заказчика либо охранной организации вправе направить любого работника из Персонала Подрядчика на медицинское освидетельствование на предмет *факта* употребления наркотического, психотропного, алкогольного или иного *вещества*. В случае выявления/установления Заказчиком у кого-либо из Персонала Подрядчика признаков наркотического, психотропного, алкогольного или иного опьянения и/или факта употребления, Подрядчик обязан незамедлительно отправить всю бригаду, выполняющую Работы по Договору, в полном составе или, по согласованию количественного и списочного состава с руководителем охраны труда Заказчика (или лица его замещающего), выборочно, но не менее 5 (пяти) человек, в ближайшее специализированное медицинское учреждение (наркодиспансер), при его наличии в городе/поселке для прохождения медицинского освидетельствования. В случае отсутствия такого учреждения на расстоянии 40 км от Площадки/территории Заказчика, медицинское освидетельствование выполняется квалифицированным персоналом Заказчика. Справки с результатами медицинского освидетельствования всего Персонала Подрядчика, отправленного на медицинское освидетельствование в соответствии с настоящим пунктом, должны быть представлены дежурному фельдшеру Заказчика не позднее 2 часов с момента выявления/установления Заказчиком у кого-либо из Персонала Подрядчика признаков наркотического, психотропного, алкогольного или иного опьянения и/или факта употребления.

1.2.3. Самостоятельно изменять место проведения Работ и маршрут передвижения Персонала Подрядчика.

1.2.4. Выносить с Площадки/территории Заказчика без оформления пропуска Заказчиком любой инструмент, материалы и любое другое имущество.

1.2.5. Выполнять Работы без соответствующего действующего разрешения, наряда, допуска, распоряжения и/или анализа безопасности работ от Заказчика или с его превышением.

1.2.6. Выполнять Работы (включая надзор) на работающем оборудовании, находящемся под напряжением, если Персонал Подрядчика может подвергаться воздействию токопроводящих частей, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

1.2.7. Выполнять Работы, если Персонал Подрядчика подвержен опасности падения с высоты (при работе на высоте более 1.3 метра выше от уровня пола или рабочей площадки), без подмостей или без соответствующего ограждения и/или мер по предотвращению падения (например, полный ляточный пояс с соответствующим анкерным креплением). Выполнять Работы, выполняемые методом промышленного альпинизма, без использования индивидуальных средств защиты от падения (альпинистской обвязки).

1.2.8. Выполнять Работы, если Персонал Подрядчика подвержен влиянию опасных материалов, которые запрещены законодательством Республики Казахстан (например: асбест), кроме случаев, когда это прямо предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

1.2.9. Снимать блокировочные устройства, замки и/или плакаты (например: бирки, замки по процедуре LOTO, блокировочные устройства на ячейках), которые предусмотрены в соответствии с правилами безопасности Заказчика.

1.2.10. Присутствовать в опасных зонах при работающем оборудовании (краны или бульдозеры и т.д.), кроме случаев, когда это прямо предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

1.2.11. Выполнять Работы на оборудовании без выполнения технических мероприятий, препятствующих его ошибочному включению в работу (пуск электродвигателя, подача давления, электроэнергии и др.), самопроизвольному перемещению или движению.

1.2.12. Высадка или посадка в автотранспорт во время его движения.

1.2.13. Нарушать требования пожарной безопасности, нарушать производственный процесс, создавать своим действием или бездействием угрозу жизни или здоровью людей, или угрозу возникновения аварийной ситуации.

1.2.14. Работать на высоте с предохранительным ляточным поясом при отсутствии отметки об испытании, с истекшим сроком испытания или дефектом.

1.2.15. Выполнять Работы отрезным или шлифовальным инструментом без защитного щитка.

- 1.2.16. Выполнять Работы без защитных очков или защитных щитков с абразивными инструментами, на металлорежущих станках и на другом оборудовании и/или приспособлениях, работа на которых может привести к повреждению органов зрения.
- 1.2.17. Выполнять ремонт сосудов и трубопроводов при избыточном давлении в них.
- 1.2.18. Выполнять Работы с применением грузоподъемных механизмов в охранной зоне линии электропередачи без наряда и разрешения организации, эксплуатирующей данную линию.
- 1.2.19. Перевозить людей вне кабины механических транспортных средств, не предназначенных или не оборудованных надлежащим образом для перевозки людей, а также на прицепах.
- 1.2.20. Управлять механическими транспортными средствами лицами моложе 18 лет и лицами, не имеющими удостоверений на право управления ими.
- 1.2.21. Находиться под поднятым, опускаемым или поднимаемым грузом.
- 1.2.22. Выполнять Работы лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования, требуемого законодательством Республики Казахстан, выполнять Работы с вредными или опасными условиями труда, если это им запрещено по законодательству Республики Казахстан, а также выполнять Работы на высоте лицами моложе 18 лет.
- 1.2.23. Курить вне мест, утвержденных в «Списке мест для курения» Заказчика.
- 1.2.24. Ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям в не предназначенных для этого местах.
- 1.2.25. Остановка вручную вращающихся и движущихся механизмов.
- 1.2.26. Эксплуатация неисправного оборудования, а также оборудования с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации.
- 1.2.27. Использование не испытанных подвесных и передвижных лесак и люльках, предназначенных для подъема людей.
- 1.2.28. Проникновение в замкнутые пространства или резервуары для отбора проб на содержание кислорода, вредных веществ, горючих и взрывоопасных газов.
- 1.2.29. Работа в замкнутом пространстве или резервуаре без отбора проб на содержание кислорода, вредных веществ, горючих и взрывоопасных газов.
- 1.2.30. Работа в замкнутом пространстве или резервуаре, содержащем вредные вещества, без наличия СИЗ.
- 1.2.31. Не соблюдение правил дорожного движения или правил передвижения по Площадке/территории Заказчика, установленных внутренними правилами Заказчика.
- 1.2.32. Находиться на Площадке/территории Заказчика без использования СИЗ, кроме случаев следования на работу и обратно после окончания рабочего дня (смены), а также в случаях, предусмотренных спецификой работы согласно правилам Заказчика.
- 1.2.33. Пуск и кратковременная работа механизмов и устройств, при отсутствии или неисправном состоянии ограждений.
- 1.2.34. Установка, снятие или правка на ходу приводных ремней.
- 1.2.35. Нахождение в кабине автомобиля или другого транспортного средства при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с использованием грузоподъемных механизмов.
- 1.2.36. Выполнение сварочных работ, работ с применением электрического и пневматического инструмента с переносных лестниц и стремянок, двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или опор.
- 1.2.37. Вентиляция подземного сооружения или резервуара кислородом.
- 1.2.38. Работать в подземном сооружении или резервуаре (кроме резервуаров для хранения топлива и масел) при температуре воздуха в нем выше 32°C допускается только в исключительных случаях (при аварии; если она грозит жизни людей, разрушению оборудования и другому) с разрешения руководителя работ и под его непосредственным руководством с принятием необходимых мер для предотвращения ожогов персонала. При температуре воздуха в подземном сооружении или резервуаре выше 32°C работа выполняется в теплой спецодежде. При наличии в подземном сооружении или резервуаре жидкой среды необходимо пользоваться резиновой обувью.
- Не допускается работа в подземном сооружении или резервуаре при уровне воды в нем выше 200 миллиметров (над уровнем пола), а также при температуре воды выше 45°C. Спуск рабочих в заполненные паром подземные сооружения и подвальные помещения независимо от температуры воздуха в них не допускается.
- 1.2.39. Выполнение работ, связанных с заменой и ремонтом арматуры на маслопроводах и с разборкой деталей регулирования (за исключением замены манометров), при работающей турбине или работающем масляном насосе.
- 1.2.40. Не применение СИЗ при производстве огневых работ, работ с газопламенной аппаратурой.
- 1.2.41. Выполнение огневых работ на пожароопасном участке без выдачи наряда-допуска и без визы лица, имеющего право давать разрешение на производство этого вида работ.

1.2.42. Отсутствие лица, ответственного за перемещение грузов кранами от цеха, (если куратор таковым не является), при выполнении работ по перемещению грузов, в случаях и на условиях, предусмотренных в применимой инструкции Заказчика.

1.2.43. Нарушение правил строповки грузов.

1.2.44. Организационными и/или техническими нарушениями при подготовке и производстве Работ по наряду-допуску считаются действия Персонала Подрядчика, если:

а) Допускающий по электрическому наряду:

- не произвел инструктаж и не ознакомил бригаду с содержанием наряда, распоряжения непосредственно на рабочем месте;

- не указал границы рабочего места;

- не показал ближайшее к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет;

- не доказал бригаде, что напряжение отсутствует, проверкой отсутствия напряжения и показом установленных заземлений.

б) Руководитель работ по электрическому наряду не находился на рабочем месте при ведении работ членами бригады.

в) Производитель работ по электрическому наряду считается допустившим грубое нарушение, если он:

- не произвел инструктаж о мерах по безопасному проведению работ, включая их технологию, использование инструмента, приспособлений, механизмов и грузоподъемных машин;

- не обеспечил наличие исправного инструмента и не организовал применение надлежащего инструмента, инвентаря средств защиты, такелажных приспособлений;

г) Допуск к работе по нарядам и распоряжениям на энергооборудовании не был произведен непосредственно на рабочем месте, при этом допускающий считается допустившим грубое нарушение, если он:

- не подготовил рабочее место, и не принял достаточных мер, в полной мере обеспечивающих безопасность производства работ;

- не произвел оформление допуска к работе и/или не в полной мере произвел инструктаж руководителя работ, производителя работ и наблюдающего.

д) Руководитель работ на энергооборудовании считается допустившим нарушение, если он:

- совместно с производителем работ не принял рабочее место от допускающего и не проверил выполнение мер безопасности, указанных в наряде;

- не осуществлял периодический надзор за работой бригад в части соблюдения ими правил техники безопасности.

е) Производитель работ на энергооборудовании считается допустившим нарушение, если он:

- не произвел четкий и полный инструктаж и указания, которые он дает членам бригады непосредственно на рабочем месте;

- не обеспечил наличие исправного инструмента и не организовал применение надлежащего инструмента, инвентаря средств защиты, такелажных приспособлений;

1.2.45. Исполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения Работ.

1.2.46. Рыбная ловля на Площадке/территории Заказчика.

2. Требования к транспорту

2.1. Транспортные средства, используемые для выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика должны быть в технически исправном состоянии. Запрещается производить ремонтные работы, санитарную обработку (очистку, мытье и т.д.) транспортных средств на территории Заказчика. Проводить обработку/ремонт транспортных средств необходимо в специально отведенных местах за пределами территории Заказчика.

2.2. Транспортные средства не должны иметь утечки жидкости или масла с узлов и механизмов, утечки бензина или солянки с баков и емкостей, утечки электролита с аккумуляторных батарей.

2.3. Запрещается оставлять транспортные средства на Площадке/территории Заказчика вне стоянок Заказчика или без Персонала Подрядчика, ответственного за данное транспортное средство.

2.4. Маршрут передвижения и место стоянки транспортных средств на Площадке/территории Заказчика должен быть согласован с руководителем подразделения Заказчика, ответственным за выполнение Работ.

3. Требования к оборудованию (машины и механизмы)

3.1. Машины и механизмы, используемые для выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика должны быть в технически исправном состоянии.

3.2. На оборудовании должна быть табличка с наименованием организации, датой следующего испытания или проверки, если это требуется законодательством Республики Казахстан.

4. Требования к инструментам и приспособлениям

4.1. Инструменты, приспособления и средства защиты, используемые при выполнении Работ на Площадке/территории Заказчика должны быть в технически исправном состоянии и применяться в соответствии с требованиями Заказчика, предусмотренными в «Правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» и «Правилах применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

4.2. Запрещается в электроустановках Заказчика использовать лестницы, изготовленные не из диэлектрического материала.

4.3. Запрещается при выполнении Работ на Площадке/территории Заказчика на высоте использовать монтажные пояса без набедренных или нагрудных лямок.

4.4. Запрещается использовать транспорт, оборудование, инструмент, приспособления и средства защиты, принадлежащие Заказчику без письменного разрешения ответственного лица Заказчика.

5. Экологические требования и запрещенные практики в области охраны окружающей среды при выполнении Работ Подрядчиком

5.1. Не допускать сокрытие информации о произошедших инцидентах в области охраны окружающей среды и информировать Заказчика о всех несоответствиях, нарушениях требований природоохранного законодательства на территории Заказчика, допущенные Подрядчиком или иными лицами в его присутствии.

5.2. Иметь и предоставлять Заказчику соответствующую разрешительную документацию на выбросы, сбросы, размещение и утилизацию отходов, согласования, сертификаты и иную документацию, требуемую для выполнения Работ.

5.3. Содержать Площадку размещения бытовых помещений Подрядчика и Площадку проведения работ в чистоте и убирать их ежедневно по окончании рабочего дня/смены.

5.4. Предоставить сертификат производителя об отсутствии полихлорированных дифенилов (ПХД), при поставке трансформаторного/турбинного масел и маслонаполненного оборудования.

5.5. Не использовать в ходе выполнения Работ Материалы, содержащие ПХД. До начала использования Материалов для выполнения Работ предоставить Заказчику копии сертификатов, выданных соответствующей специализированной организацией, подтверждающих отсутствие содержания в используемых Материалах ПХД;

5.6. Принимать меры, направленные на предотвращение возникновения проливов химических веществ и нефтепродуктов, материалов и отходов в процессе выполнения Работ.

Осуществлять собственными силами ликвидации проливов и других аварийных ситуаций, связанных с воздействием на окружающую среду с незамедлительным сообщением Заказчику.

5.7. Предоставить куратору Заказчика или руководителю цеха Заказчика, вместе с Актами выполненных работ документы, подтверждающие факт передачи на утилизацию в специализированные организации отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ, (копии счет-фактур, акты выполненных работ, приемо-сдаточные акты, талоны на утилизацию и др.).

5.8. Временно хранить отходы только в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком (контейнеры для хранения отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ, должны иметь целостную конструкцию и соответствующую маркировку).

5.9. Не допускать переполнение контейнеров, содержащих отходы производства и потребления.

5.10. Осуществлять хранение отходов в контейнерах согласно маркировке.

5.11. Производить сбор опасных отходов в емкости/контейнеры с плотно закрывающейся крышкой.

5.12. Обеспечить раздельный сбор отходов, не смешивать опасные и особые отходы с неопасными отходами, с другими видами опасных и особых отходов в процессе их производства, транспортировки и утилизации.

Не допускать на Площадках хранения химических веществ и материалов размещения их на земле, исключить захламление обрывками упаковочной тары.

5.13. Нести ответственность по хранению и использованию в производстве Работ химических веществ и материалов в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Заказчика.

5.14. Соблюдать требования, предъявляемые к временному хранению химических веществ и материалов:

- емкости, должны иметь целостную конструкцию с плотно закрывающейся крышкой;
- емкости должны быть закрытыми, когда не используются, промаркированы;
- иметь средства предотвращения и ликвидации проливов;
- вдали от несовместимых материалов (согласно паспорту безопасности);
- на специально отведенных площадках.

5.15. Не начинать производство работ без соответствующих разрешений, требующихся согласно природоохранного законодательства Республики Казахстан.

5.16. Не допускать отклонения от проекта производства работ, в части соблюдения технологического регламента по использованию материалов и их объему, заложенных в проектной документации, а также в

части исполнения мер, предотвращающих воздействие на окружающую среду, без соответствующих согласований ответственных лиц со стороны Заказчика.

Подрядчик обязан произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по его вине.

5.17. Не взаимодействовать с государственными органами, внешними заинтересованными сторонами и иными организациями относительно выполняемых Работ без предварительного согласования Заказчика.

5.18. Не использовать транспортные средства, не прошедшие государственный технический осмотр, имеющие утечки масла, антифриза, тормозной жидкости.

Все транспортные средства Подрядчика должны быть укомплектованы тентовыми конструкциями с целью защиты окружающей среды от просыпания и пыления сыпучих грузов.

5.19. Не допускать разведение открытого огня на территории Заказчика.

5.20. Не допускать хранение жидких отходов/химических веществ без средств предотвращения и ликвидации проливов;

5.21. Размещать резервуары, оборудование, содержащее жидкие опасные вещества, в местах с непроницаемым основанием, либо иметь вторичную систему удержания проливов;

5.22. Не допускать проливов опасных отходов, химических веществ и материалов на грунт и дренажи;

5.23. Не использовать при производстве Работ химические вещества и материалы, не разрешенные к использованию законодательством Республики Казахстан и требованиями Заказчика;

5.24. Не допускать переполнение емкостей, содержащих химические вещества и материалы;

5.25. Предоставлять Заказчику Перечень используемого оборудования для выполнения Работ, являющегося источниками выделения загрязняющих веществ, и информировать Заказчика об изменении Перечня оборудования. Содержать оборудование, механизмы, применяемые Подрядчиком для выполнения Работ на территории Заказчика в надлежащем технически исправленном состоянии, с целью исключения возникновения утечек масла, антифриза, тормозной жидкости..

5.26. Возместить Заказчику стоимость штрафа, при предъявлении государственным органом штрафных санкций Заказчику за нарушения действующего законодательства, произошедшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в сроки и в сумме, указанные в акте государственного органа.

6. Оказание помощи Заказчиком Персоналу Подрядчика

6.1. При наличии возможности и с учетом всех приведенных ниже положений, Заказчик во время выполнения Работ Подрядчиком на Площадке/территории Заказчика предоставляет Персоналу Подрядчика такой же доступ к учреждениям по оказанию неотложной медицинской помощи, к услугам неотложной медицинской помощи и медицинской эвакуации (далее - «Оказание Помощи»), какой Заказчик обеспечивает персоналу Заказчика.

6.2. Заказчик не осуществляет контроля за фактом использования и за процессом использования Персоналом Подрядчика Оказания Помощи, предоставленного Заказчиком, и Заказчик не несет ответственности за отказ от использования или ненадлежащее использование Оказания Помощи Персоналом Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за доступность, своевременность, качество Оказания Помощи или за соответствие Оказания Помощи каким-либо нормам, требованиям или стандартам.

7. Штрафные санкции

7.1. По факту обнаружения Заказчиком каждого случая Персоналом Подрядчика нарушения условий, предусмотренных настоящим Приложением, Заказчиком составляются Указания по безопасности и охране труда по форме, приложенной к Договору.

7.2. За каждое нарушение Персоналом Подрядчика условий, предусмотренных настоящим Приложением, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере, определяемом Заказчиком:

7.2.1. За первое нарушение Персоналом Подрядчика в размере, не превышающем 10 месячных расчетных показателей (МРП).

7.2.2. За каждое последующее нарушение Персоналом Подрядчиком любых условий настоящего Приложения в размере, не превышающем 20 МРП.

«Подрядчик»

«Заказчик»

АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая
Компания»

Генеральный директор

А.А. Казановский

Кому _____
(должность руководителя предприятия,
фамилия и инициалы)

(наименование подрядчика)

УКАЗАНИЯ

по безопасности и охране труда
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Мною _____

(должность, фамилия и инициалы куратора/проверяющего лица)

в процессе проверки в рамках контроля опасных ситуаций, проведённой

(наименование проверенного участка/оборудования/коммуникаций ВСП/ПП)

в
присутствии _____

(должности, Ф.И.О. представителей проверяемого ВСП)

выявлены следующие нарушения требований безопасности и охраны труда, влекущие за собой
возникновение опасной ситуации:

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Наименование нормативного документа в области БиОТ, требования которого нарушены, №№ пунктов	Код нарушения (ОС)	Причины допущенного нарушения требований БиОТ	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5	6	7

На основании требований Регламента по БиОТ «Мониторинг состояния безопасности и охраны труда в АО
«ЦАЭК» Вам предписывается устранить указанные нарушения в установленные для этого сроки и не
позднее _____ направить _____

(дата)

(должность, Ф.И.О. куратора/ проверяющего лица)

и в службу БиОТ _____ Отчёт-уведомление об устранении выявленных
несоответствий. _____ (наименование ПП)

Указание выдал:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Указание

для

исполнения

получил:

(дата, время)

(должность

руководителя)

ВСП/ПП _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Предприятие _____
Цех, служба _____
Склад _____

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ СО СКЛАДА ЦЕХА В РАБОТУ

№ п/п	Код МПЗ	Наименование материалов, сорт, марка, размер	Количество	Номер рабочего задания - описание	Номер оборудования - описание	Требуемая дата выдачи	Фактическая дата выдачи
			Единица измерения				
1							

Должность	Подпись	Расшифровка подписи
Должность	Подпись	Расшифровка подписи
